

2012-07-23 15:52

FAX>FAX 02P/09P

12年07月23日(月) 15時51分 宛先:情報連絡室様

発信:関西電力(株) 地域共生 広報室

R:109

P.02

大飯発電所 3号機、4号機のプラント起動状況について（お知らせ）

平成24年7月23日
関西電力株式会社

平成24年7月23日における大飯発電所3号機、4号機のプラント起動状況について別添のとおりお知らせします。

以上

7/23(月)15時版

関西電力(株)
大飯発電所

大飯発電所3、4号機のプラント起動状況について
(7月23日(月)14時時点)

1. 定期検査工程の進捗状況

	4号機	3号機
本日の状況	出力上昇試験 ・出力上昇試験	定格熱出力一定運転中
明日の予定	出力上昇試験 ・出力上昇試験	定格熱出力一定運転中

添付資料-1:定期検査工程表

2. 発電所の運転状況(パラメータおよび諸検査)

○大飯4号機

- ・プラント状態は異常なし

添付資料-2:大飯4号機運転状況(パラメータ 13時時点)

- ・諸検査の状況

本日の検査実績あり、明日の検査予定なし

添付資料-3:大飯4号機検査一覧表

○大飯3号機:定格熱出力一定運転中

- ・プラント状態は異常なし

添付資料-4:大飯3号機運転状況(パラメータ 13時時点)

- ・諸検査の状況


本日の検査実績なし、明日の検査予定あり

添付資料-5:大飯3号機検査一覧表


3. 特記事項

特になし

大飯発電所3号機、4号機の作業工程

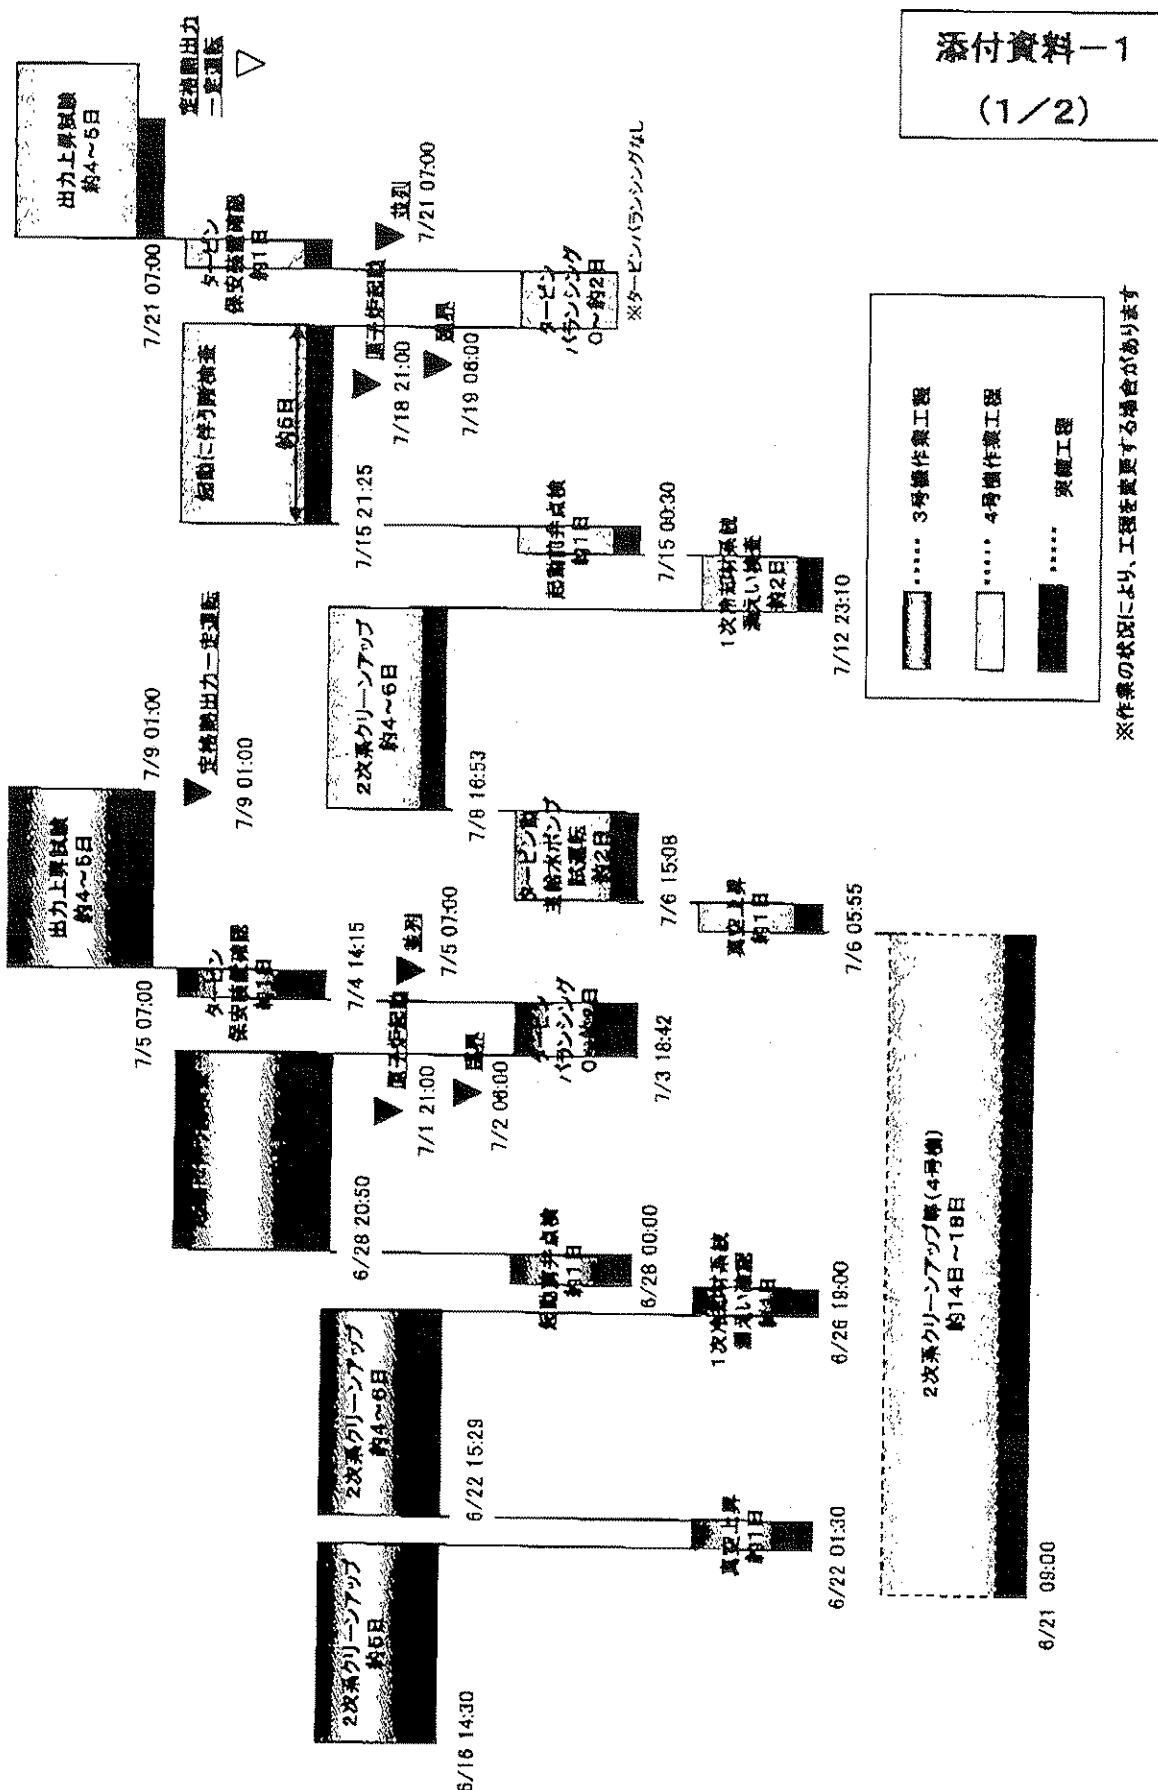


大飯発電所4号機 発電機出力上昇工程

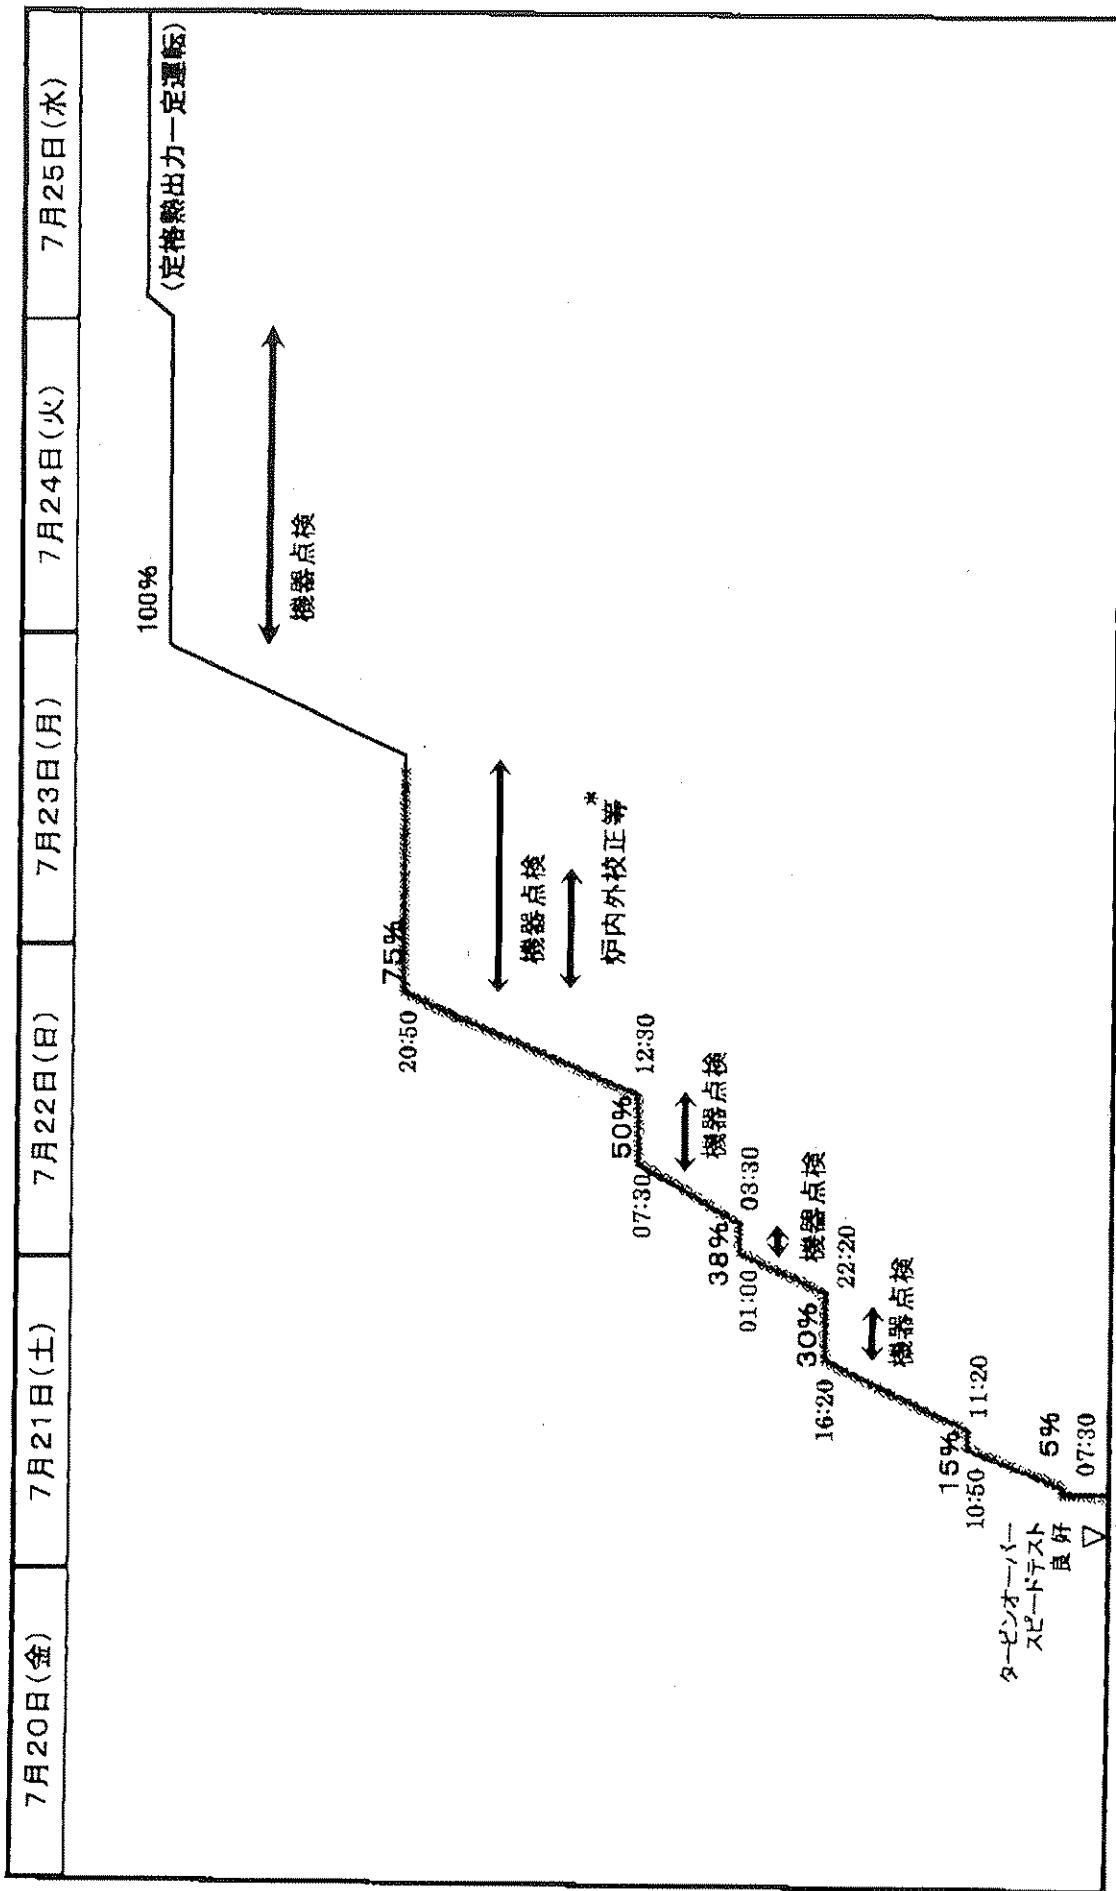
添付資料-1
(2/2)

添付資料-2

大飯発電所 4号機 運転パラメータ (平成24年7月23日13:00時点)

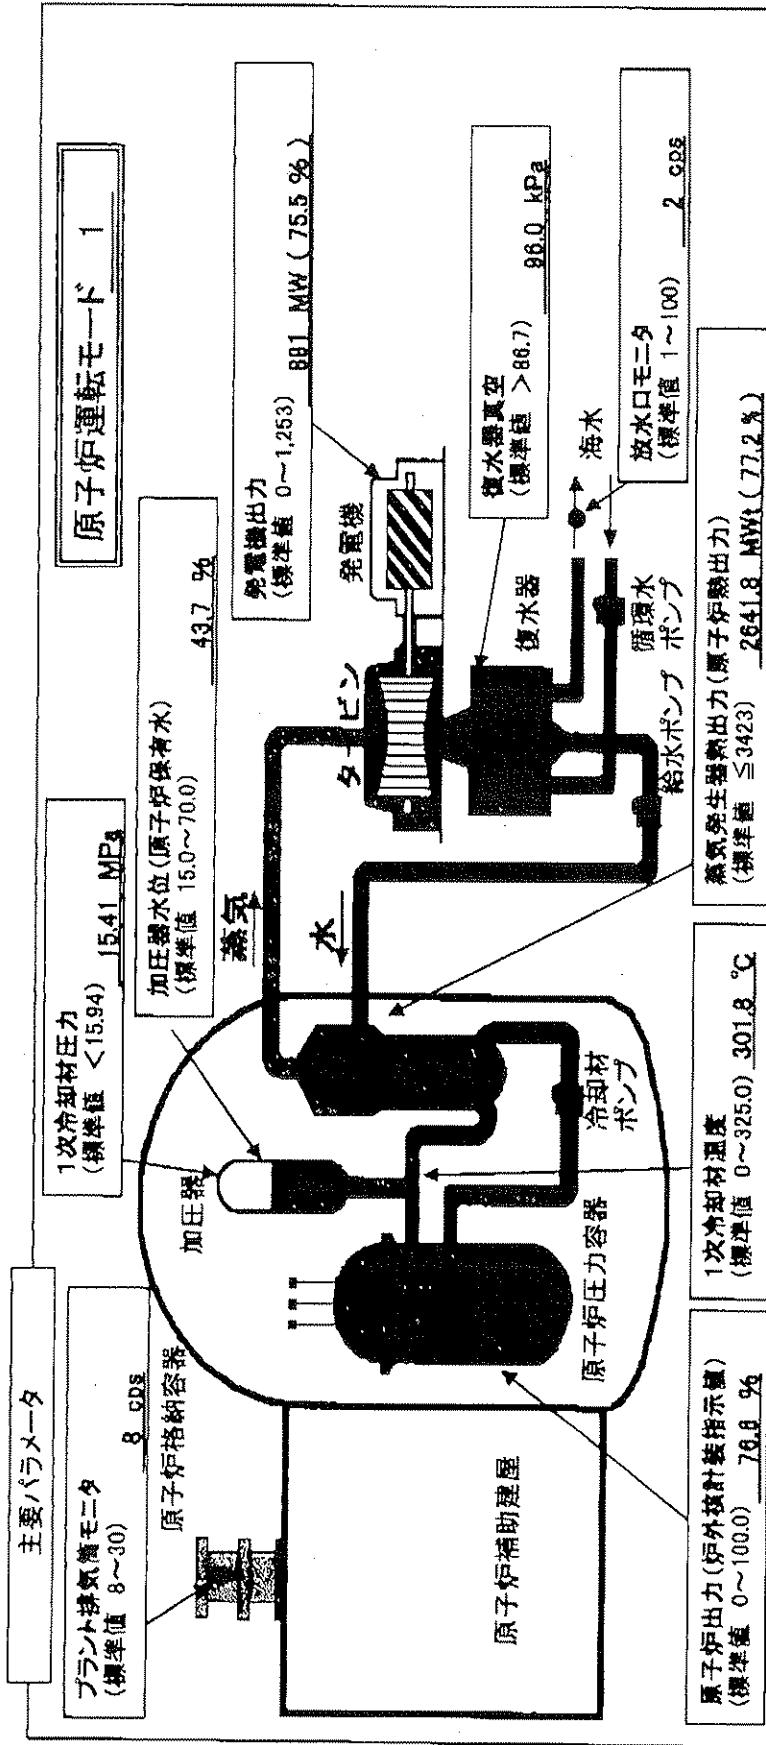

気象、モニタスト・モニタステーション

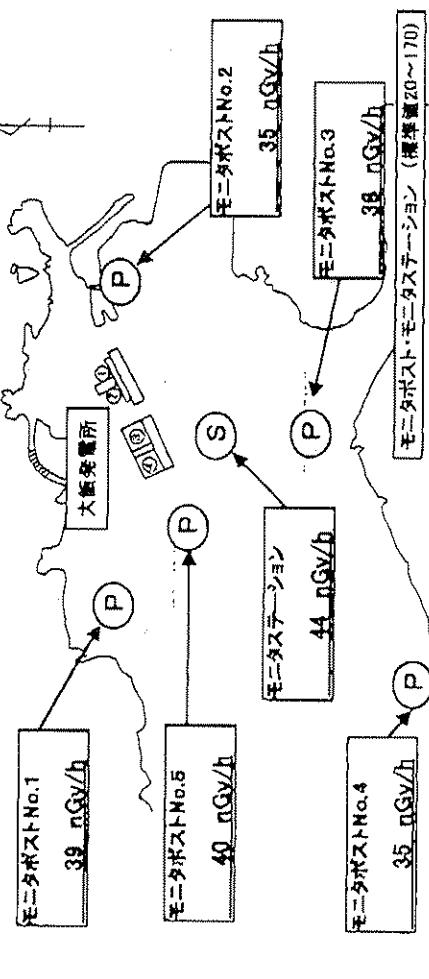

大飯発電所 気象

天候	晴れ
風速	2.6 m/s
風向	北東

添付資料-3

大飯4号機 検査一覧表(定格熱出力一定運転まで) [7/23(月)]

<定期事業者検査(事業者が実施)>

定期検査 対象	検査名	完了 状況 (※1)	検査実施状況(※2)		
			昨日	本日	明日
☆ 制御棒駆動系機能検査	全完				
☆ 主蒸気安全弁機能検査	全完				
☆ 蒸気タービン性能検査	全完				
☆ クラス1機器供用期間中検査	全完				
☆ 蒸気タービン性能検査(タービン過速度トリップ試験)	全完				
☆ 加圧器逃がし弁漏えい検査	全完				
☆ 補助給水系機能検査	全完				
☆ 原子炉停止余裕検査	全完				
☆ 安全保護系設定値確認検査	一部 完了				
☆ 制御用空気圧縮系機能検査	全完				
☆ 蒸気タービン開放検査	全完				
炉物理検査	一部 完了	○			
構造健全性検査	全完				
1次冷却材ポンプ機能検査	一部 完了				
核計装設備検査	一部 完了	○			
計測制御系機能検査	一部 完了				
計測制御系監視機能検査	一部 完了				
放射線監視装置機能検査	一部 完了				
2次系配管検査	一部 完了				
2次系ポンプ機能検査	全完				
総合インターロック検査	全完				
制御棒位置指示装置設定値検査	全完				


<使用前検査(国が実施)>

検査名	完了 状況 (※1)	検査実施状況(※2)		
		昨日	本日	明日
加圧器管台他補修工事(イ)使用前検査	全完			

※1:定期事業者検査の全項目が完了した検査は「全完」、検査を継続するものは「一部完了」と記載。

※2:昨日から明日にかけて、検査実施日に「○」を記載。

大飯発電所 3号機 運転パラメータ (平成24年7月23日13:00時点)

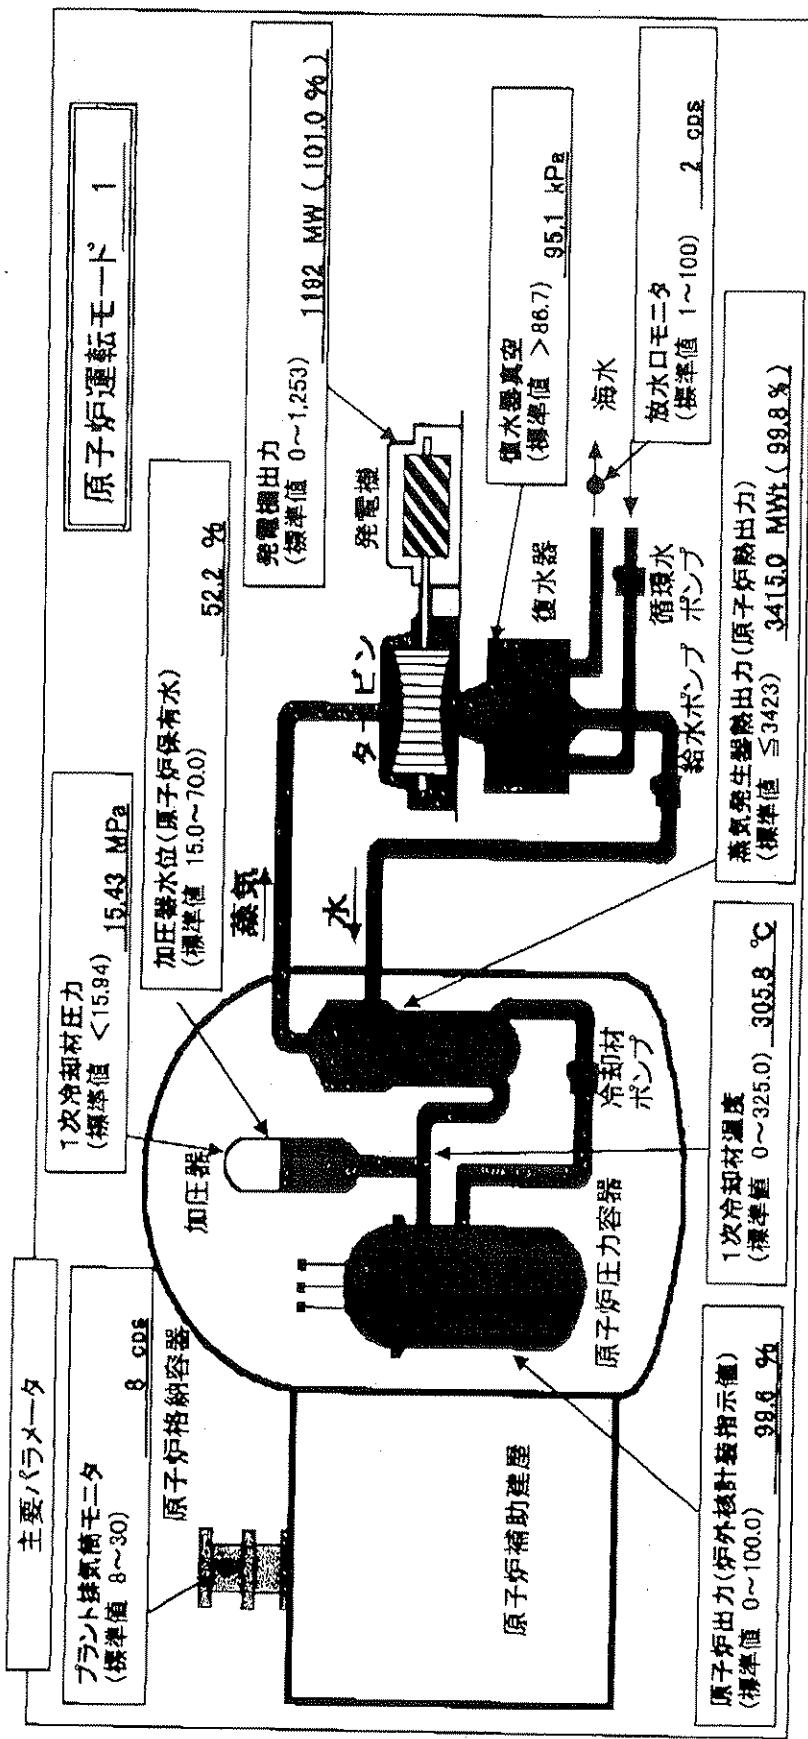

添付資料-5

大飯3号機 検査一覧表(定格熱出力一定運転以降) [7/23(月)]

<定期事業者検査(事業者が実施)>

定期検査 対象	検査名	完了 状況 (※1)	検査実施状況(※2)		
			昨日	本日	明日
☆ 総合負荷性能検査					
☆ 安全保護系設定値確認検査		全完			
炉物理検査		全完			
1次冷却材ポンプ機能検査		全完			
核計装設備検査		全完			
計測制御系機能検査		全完			
計測制御系監視機能検査		全完			
放射線監視装置機能検査		全完			
2次系配管検査		全完			
液体廃棄物処理系機能検査		一部 完了			○
蒸気タービン附属設備機能検査		全完			

<使用前検査(国が実施)>

検査名	完了 状況 (※1)	検査実施状況(※2)		
		昨日	本日	明日
蒸気タービン改造工事(木)使用前検査				
加圧器管合他補修工事(木)使用前検査				

※1:定期事業者検査の全項目が完了した検査は「全完」、検査を継続するものは「一部完了」と記載。
 ※2:昨日から明日にかけて、検査実施日に「○」を記載。
