

大飯発電所3号機、4号機のプラント起動状況について(お知らせ)

平成24年7月18日  
関西電力株式会社

平成24年7月18日における大飯発電所3号機、4号機のプラント  
起動状況について別添のとおりお知らせします。

以上

7/18(水)15時版

関西電力(株)  
大飯発電所

大飯発電所3、4号機のプラント起動状況について  
(7月18日(水)14時時点)

## 1. 定期検査工程の進捗状況

	4号機	3号機
本日の状況	起動に伴う諸検査 ・各種点検・試験 ・原子炉起動 ・臨界操作	定格熱出力一定運転中
明日の予定	起動に伴う諸検査 ・臨界操作 ・臨界 ・炉物理検査 ・タービン起動準備	定格熱出力一定運転中

添付資料-1:定期検査工程表

## 2. 発電所の運転状況(パラメータおよび諸検査)

## ○大飯4号機

- ・プラント状態は異常なし

添付資料-2:大飯4号機運転状況(パラメータ 13時時点)

- ・諸検査の状況

本日の検査実績あり、明日の検査予定あり

添付資料-3:大飯4号機検査一覧表

## ○大飯3号機:定格熱出力一定運転中

- ・プラント状態は異常なし

添付資料-4:大飯3号機運転状況(パラメータ 13時時点)

- ・諸検査の状況


本日の検査実績なし、明日の検査予定なし

添付資料-5:大飯3号機検査一覧表

## 3. 特記事項

特になし

# 大飯発電所3号機、4号機の作業工程

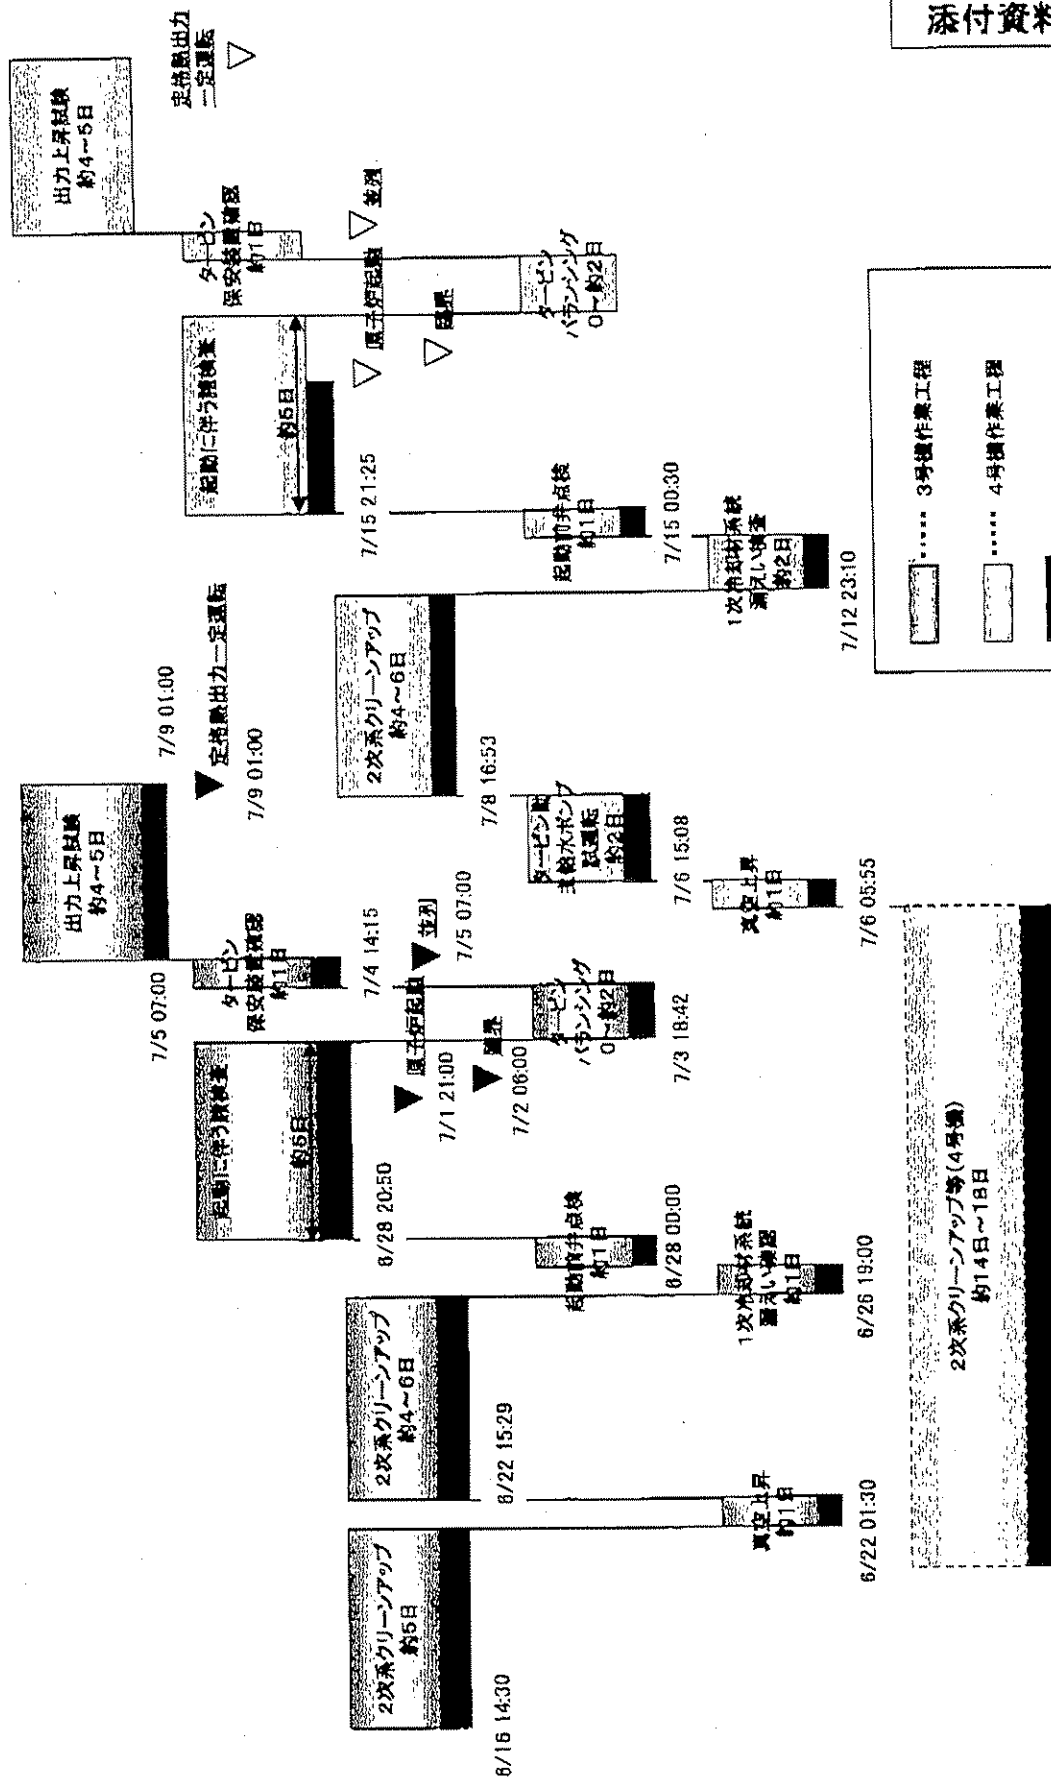

添付資料-1

..... 3号機作業工程

..... 4号機作業工程

..... 実績工程

※作業の状況により、工程を変更する場合があります

6/21 09:00

6/22 01:30

6/26 19:00

7/6 08:55

7/12 23:10

7/8 15:08

7/15 00:30

6/16 14:30

6/22 15:29

6/28 00:00

7/3 18:42

7/8 16:53

7/15 21:25

7/22 06:00

7/29 07:00

7/9 01:00

7/5 07:00

7/1 21:00

7/4 14:15

7/9 01:00

7/15 21:25

7/22 06:00

7/29 07:00

8/5 20:50

8/12 00:00

8/19 00:00

8/26 00:00

9/2 00:00

9/9 00:00

9/16 00:00

9/23 00:00

9/30 00:00

10/7 00:00

10/14 00:00

10/21 00:00

10/28 00:00

11/4 00:00

11/11 00:00

11/18 00:00

11/25 00:00

12/2 00:00

12/9 00:00

12/16 00:00

12/23 00:00

12/30 00:00

1/6 00:00

1/13 00:00

1/20 00:00

1/27 00:00

2/3 00:00

2/10 00:00

2/17 00:00

2/24 00:00

3/2 00:00

3/9 00:00

3/16 00:00

3/23 00:00

3/30 00:00

4/6 00:00

4/13 00:00

4/20 00:00

4/27 00:00

5/4 00:00

5/11 00:00

5/18 00:00

5/25 00:00

6/1 00:00

6/8 00:00

6/15 00:00

6/22 00:00

6/29 00:00

7/6 00:00

7/13 00:00

7/20 00:00

7/27 00:00

8/3 00:00

8/10 00:00

8/17 00:00

8/24 00:00

8/31 00:00

9/7 00:00

9/14 00:00

9/21 00:00

9/28 00:00

10/5 00:00

10/12 00:00

10/19 00:00

10/26 00:00

11/2 00:00

11/9 00:00

11/16 00:00

11/23 00:00

11/30 00:00

12/7 00:00

12/14 00:00

12/21 00:00

12/28 00:00

1/4 00:00

1/11 00:00

1/18 00:00

1/25 00:00

2/1 00:00

2/8 00:00

2/15 00:00

2/22 00:00

2/29 00:00

3/6 00:00

3/13 00:00

3/20 00:00

3/27 00:00

4/3 00:00

4/10 00:00

4/17 00:00

4/24 00:00

5/1 00:00

5/8 00:00

5/15 00:00

5/22 00:00

5/29 00:00

6/5 00:00

6/12 00:00

6/19 00:00

6/26 00:00

7/3 00:00

7/10 00:00

7/17 00:00

7/24 00:00

7/31 00:00

8/7 00:00

8/14 00:00

8/21 00:00

8/28 00:00

9/4 00:00

9/11 00:00

9/18 00:00

9/25 00:00

10/2 00:00

10/9 00:00

10/16 00:00

10/23 00:00

10/30 00:00

11/6 00:00

11/13 00:00

11/20 00:00

11/27 00:00

12/4 00:00

12/11 00:00

12/18 00:00

12/25 00:00

1/1 00:00

1/8 00:00

1/15 00:00

1/22 00:00

1/29 00:00

2/5 00:00

2/12 00:00

2/19 00:00

2/26 00:00

3/5 00:00

3/12 00:00

3/19 00:00

3/26 00:00

4/2 00:00

4/9 00:00

4/16 00:00

4/23 00:00

4/30 00:00

5/7 00:00

5/14 00:00

5/21 00:00



5/28 00:00

6/4 00:00

6/11 00:00

添付資料-2

大飯発電所 4号機 運転パラメータ (平成24年7月18日13:00時点)

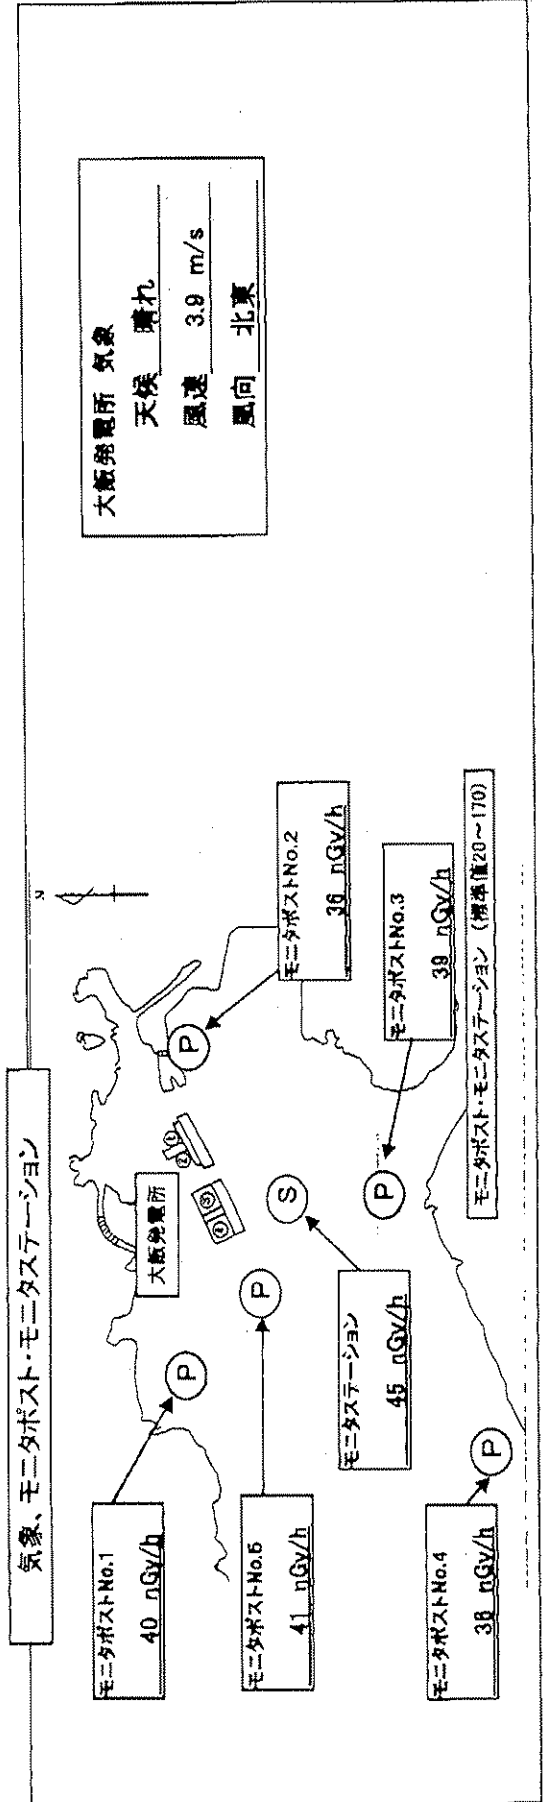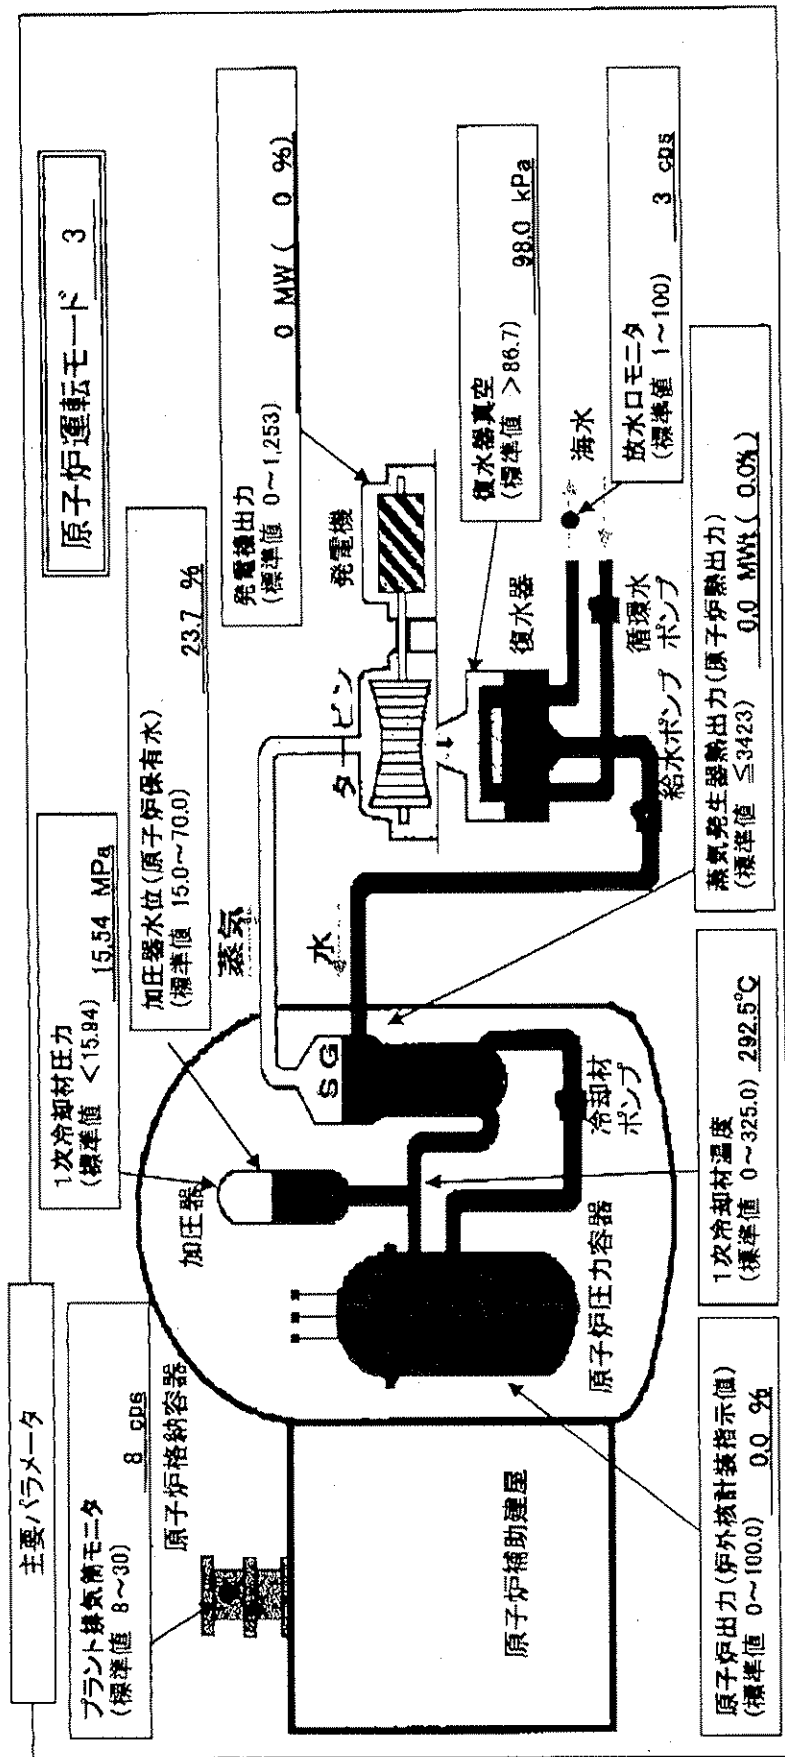

## 添付資料-3

## 大飯4号機 検査一覧表(定格熱出力一定運転まで) [7/18(水)]

## &lt;定期事業者検査(事業者が実施)&gt;

定期検査 対象	検査名	完了 状況 (※1)	検査実施状況(※2)		
			昨日	本日	明日
☆	制御棒駆動系機能検査	全完		○	
☆	主蒸気安全弁機能検査	全完	○		
☆	蒸気タービン性能検査	一部 完了			
☆	クラス1機器供用期間中検査	全完	○		
☆	蒸気タービン性能検査(タービン過速度トリップ試験)				
☆	加圧器逃がし弁漏えい検査	全完		○	
☆	補助給水系機能検査	一部 完了		○	
☆	原子炉停止余裕検査				○
☆	安全保護系設定値確認検査	一部 完了			○ <sup>(注)</sup>
☆	制御用空気圧縮系機能検査	全完			
☆	蒸気タービン開放検査	全完			
	炉物理検査			○	○
	構造健全性検査	全完	○		
	1次冷却材ポンプ機能検査	一部 完了	○		
	核計装設備検査	一部 完了		○	
	計測制御系機能検査	一部 完了			
	計測制御系監視機能検査	一部 完了			○ <sup>(注)</sup>
	放射線監視装置機能検査	一部 完了			
	2次系配管検査	一部 完了	○		
	2次系ポンプ機能検査	全完			
	総合インターロック検査	全完			
	制御棒位置指示装置設定値検査	全完			

(注) 臨界後に確認するデータ結果により、設定値の変更が不要な場合は当該検査は実施しない。

## &lt;使用前検査(国が実施)&gt;


検査名	完了 状況 (※1)	検査実施状況(※2)		
		昨日	本日	明日
加圧器管台他補修工事(イ)使用前検査	全完			

※1: 定期事業者検査の全項目が完了した検査は「全完」、検査を継続するものは「一部完了」と記載。

※2: 昨日から明日にかけて、検査実施日に「○」を記載。

添付資料-4

大飯発電所 3号機 運転パラメータ (平成24年7月18日13:00時点)

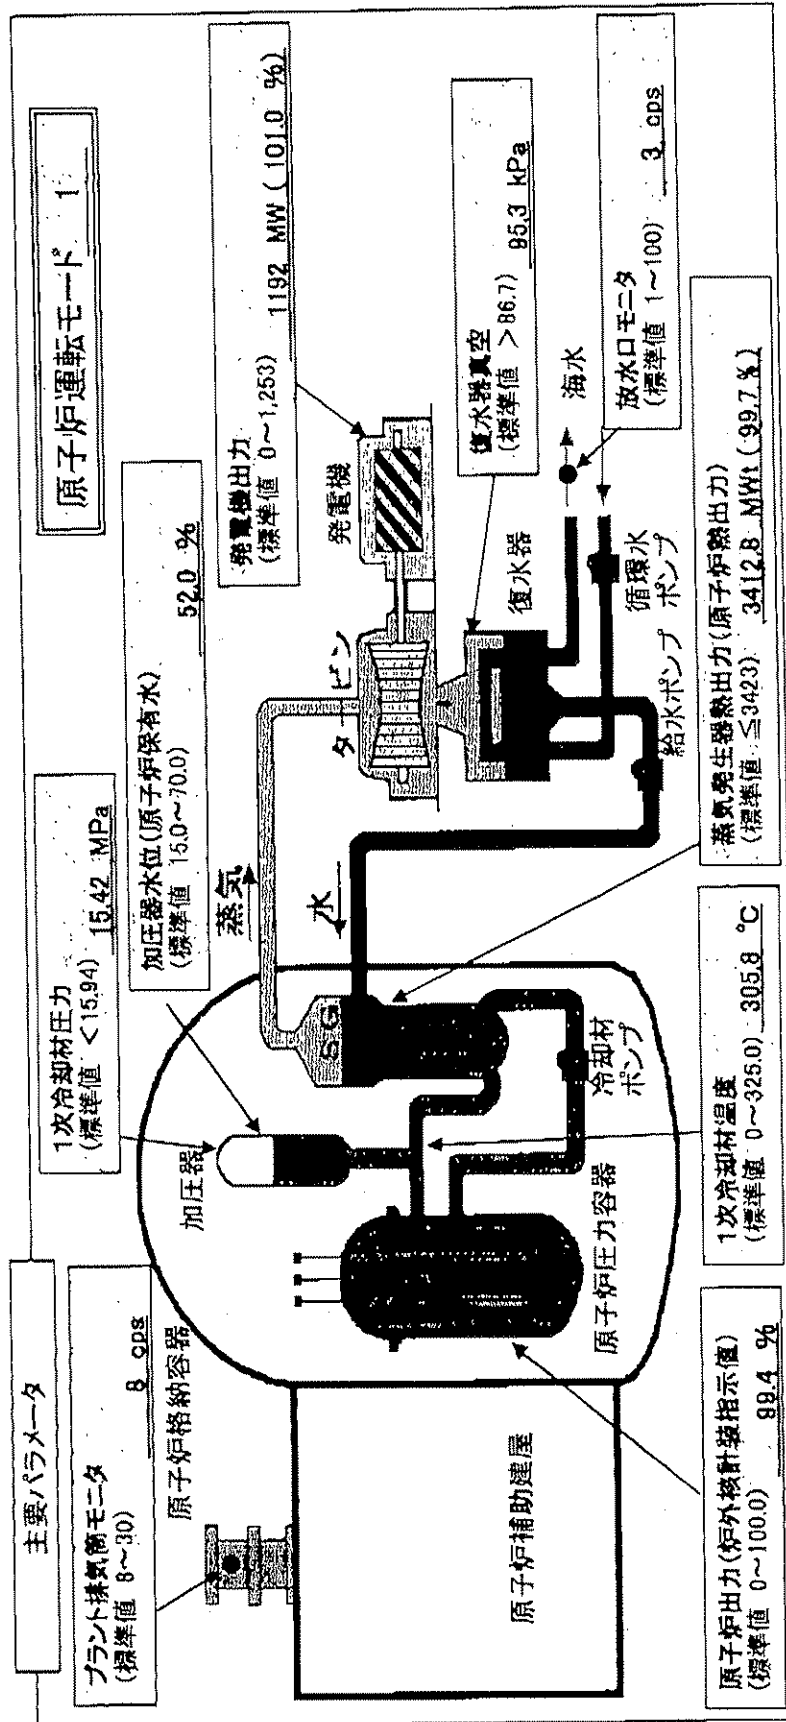

## 添付資料-5

## 大飯3号機 検査一覧表(定格熱出力一定運転以降) [7/18(水)]

## &lt;定期事業者検査(事業者が実施)&gt;

定期検査 対象	検査名	完了 状況 (※1)	検査実施状況(※2)		
			昨日	本日	明日
☆	総合負荷性能検査				
☆	安全保護系設定値確認検査	全完			
	炉物理検査	全完			
	1次冷却材ポンプ機能検査	全完			
	核計装設備検査	全完			
	計測制御系機能検査	全完			
	計測制御系監視機能検査	全完			
	放射線監視装置機能検査	全完			
	2次系配管検査	全完			
	液体廃棄物処理系機能検査	一部 完了			
	蒸気タービン附属設備機能検査				

## &lt;使用前検査(国が実施)&gt;

検査名	完了 状況 (※1)	検査実施状況(※2)		
		昨日	本日	明日
蒸気タービン改造工事(木)使用前検査				
加圧器管台他補修工事(木)使用前検査				

※1: 定期事業者検査の全項目が完了した検査は「全完」、検査を継続するものは「一部完了」と記載。

※2: 昨日から明日にかけて、検査実施日に「○」を記載。
