

大飯発電所3号機、4号機のプラント起動状況について (お知らせ)

平成24年7月6日  
関西電力株式会社

平成24年7月6日における大飯発電所3号機、4号機のプラント  
起動状況について別添のとおりお知らせします。

以上

7/6(金)15時版

関西電力(株)  
大飯発電所

大飯発電所3、4号機のプラント起動状況について  
(7月6日(金)14時時点)

## 1. 定期検査工程の進捗状況

|       | 3号機               | 4号機   |
|-------|-------------------|---|
| 本日の状況 | 出力上昇試験<br>・出力上昇試験 | 2次系クリーンアップ<br>・2次系冷水循環運転(全系統)<br>・復水器真空上昇試験 05:55～<br>・タービン動主給水ポンプ試運転 |
| 明日の予定 | 出力上昇試験<br>・出力上昇試験 | 2次系クリーンアップ<br>・2次系冷水循環運転(全系統)<br>・タービン動主給水ポンプ試運転                      |

添付資料-1:定期検査工程表

## 2. 発電所の運転状況(パラメータ)

プラント状態は異常なし

添付資料-2:大飯3号機運転状況(パラメータ 13時時点)

大飯4号機運転状況(パラメータ 13時時点)

## 3. 諸検査の状況

本日の検査実績あり


明日の検査予定あり

添付資料-3:検査一覧表

## 4. 特記事項

特になし

# 大飯発電所3号機、4号機の作業工程

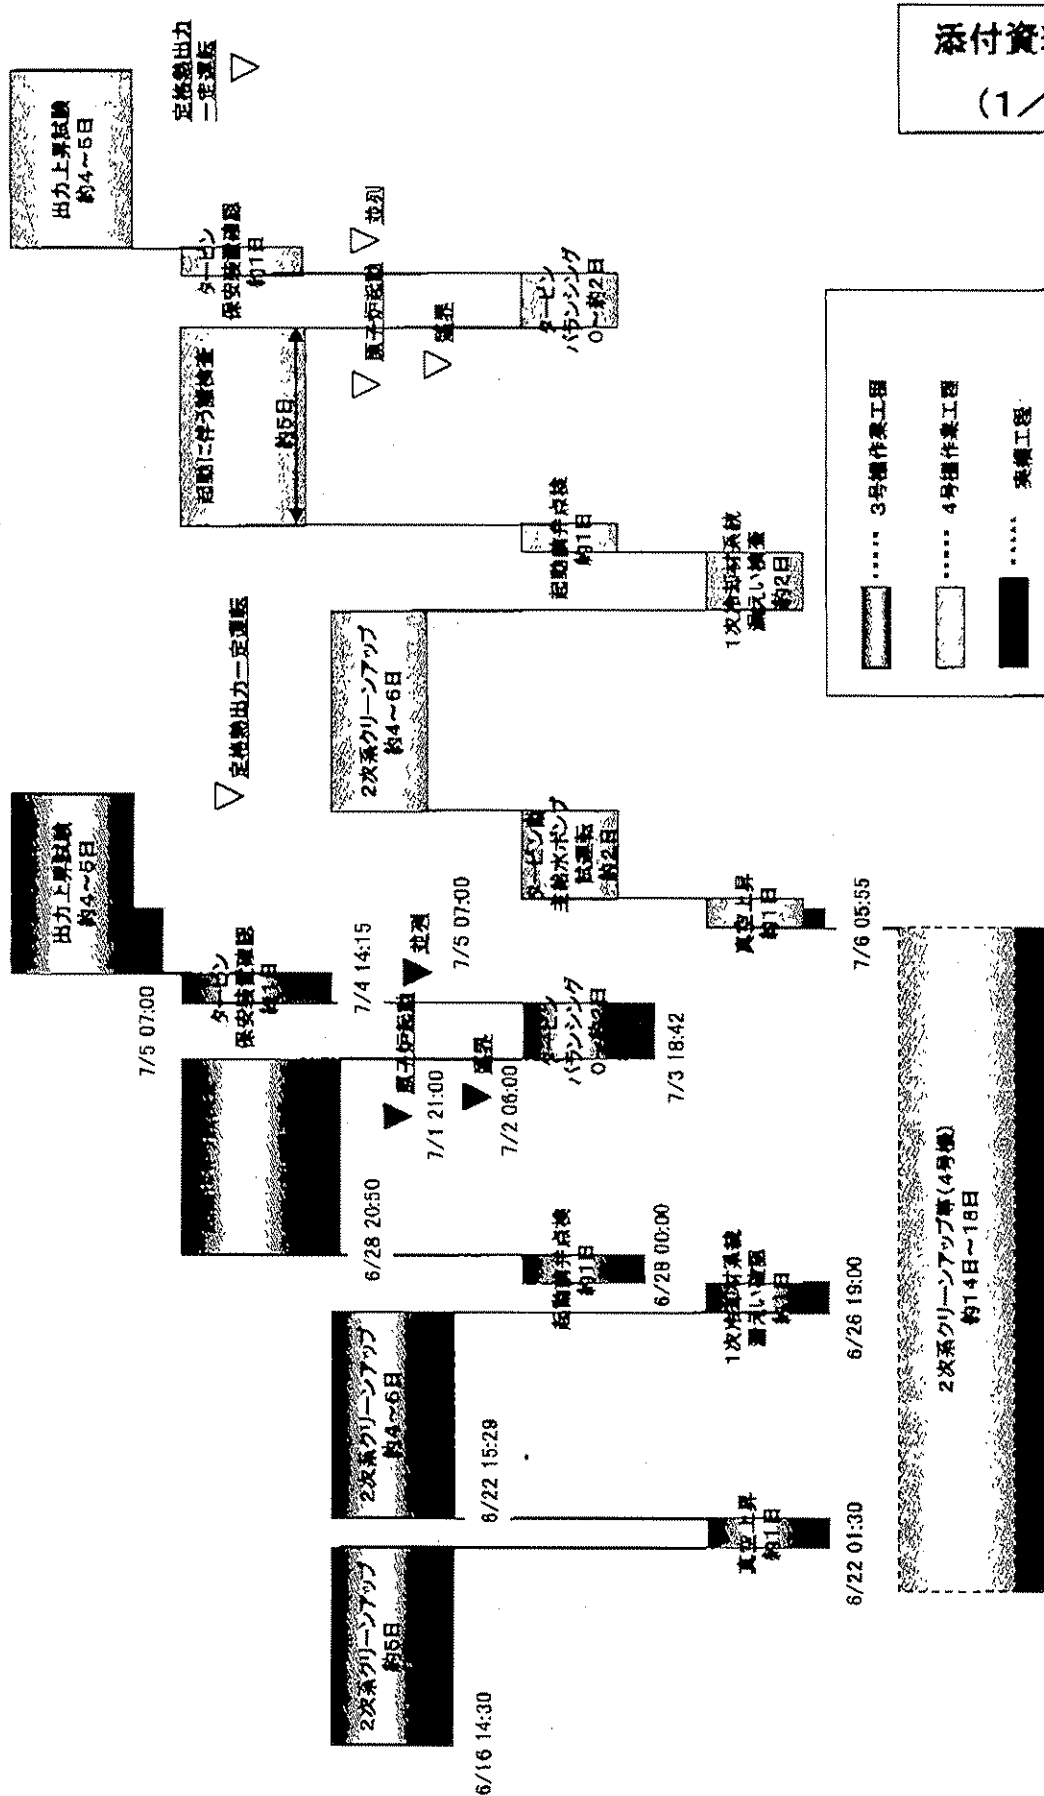


添付資料-1  
(1/2)

※作業の状況により、工程を変更する場合があります

添付資料-1  
(2/2)

# 大飯発電所3号機 発電機出力上昇工程


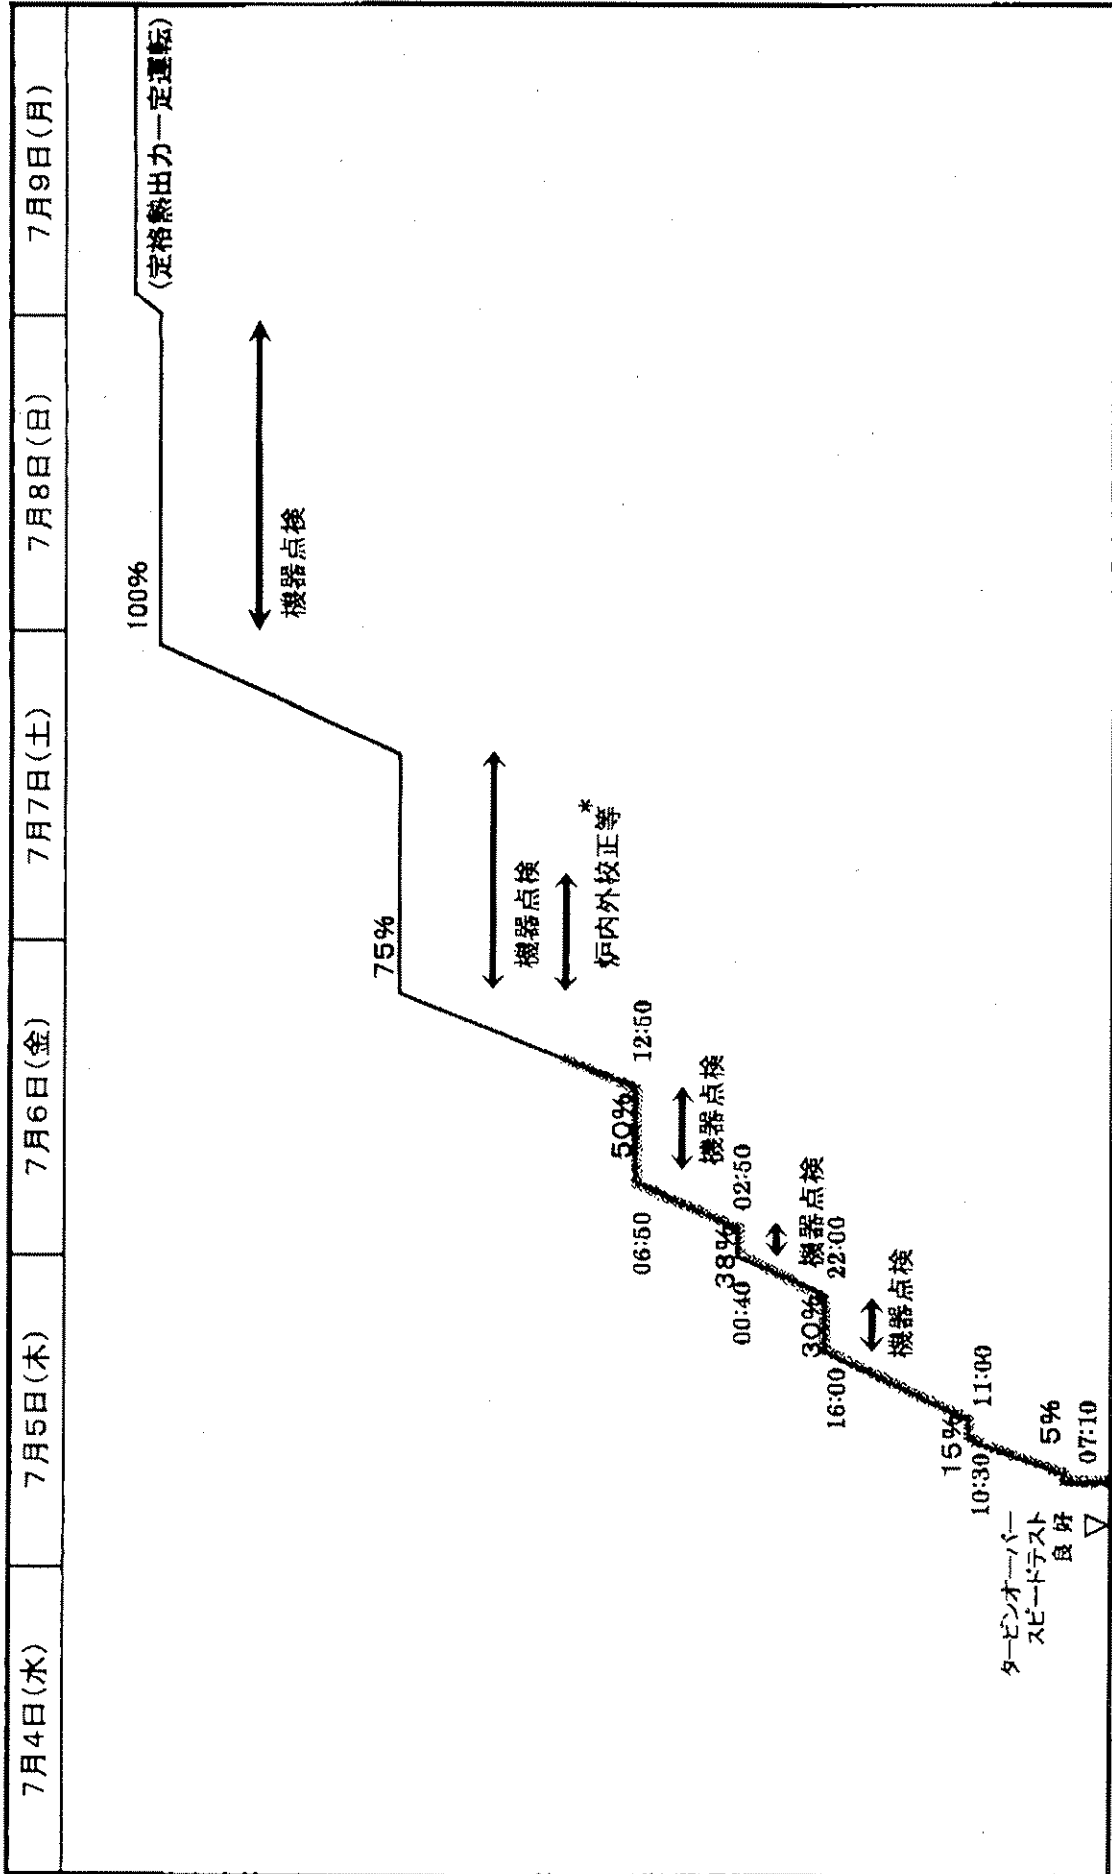


\*: 炉内の出力分布と炉外核計測装置が測定している電流値との相関関係を解析し、解析に基づき炉外核計測装置の校正を行う

発電機並列  
07:00


添付資料-2  
(1/2)

大飯発電所 3号機 運転パラメータ (平成24年7月6日13:00時点)

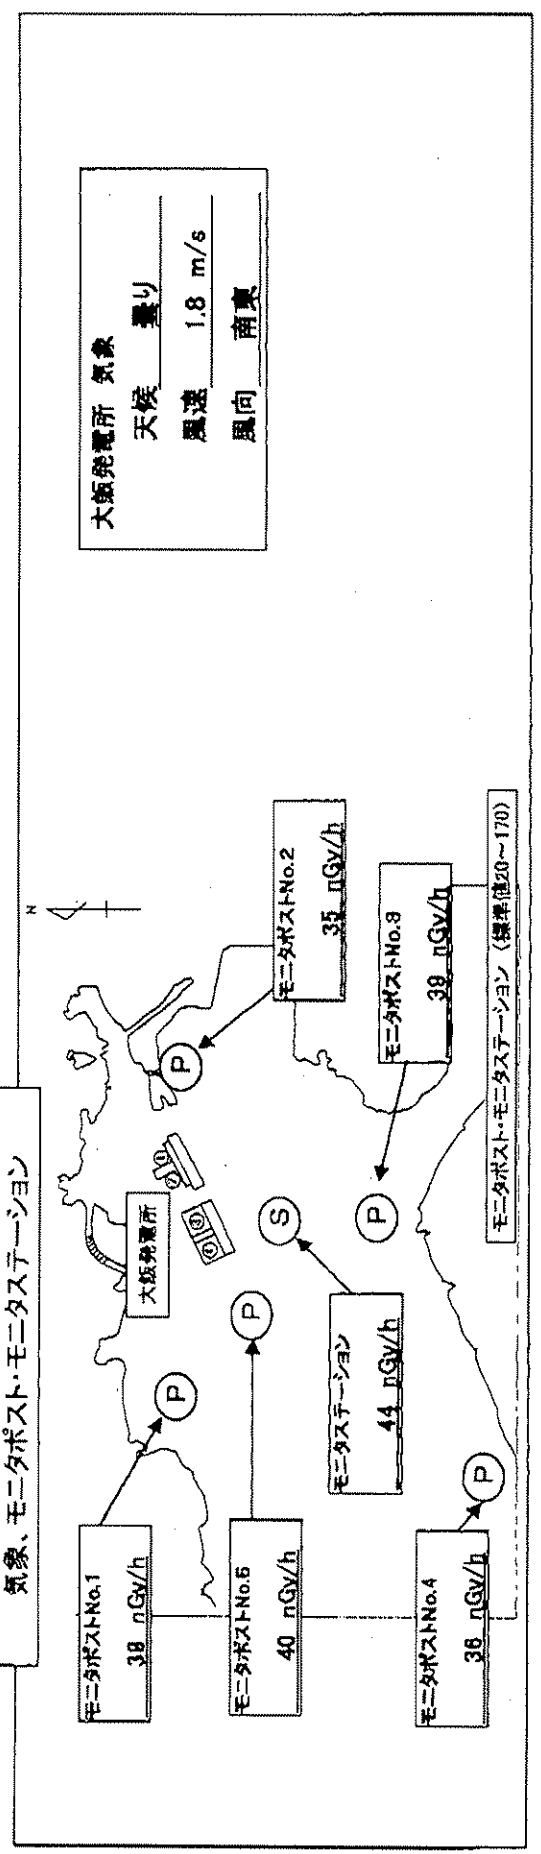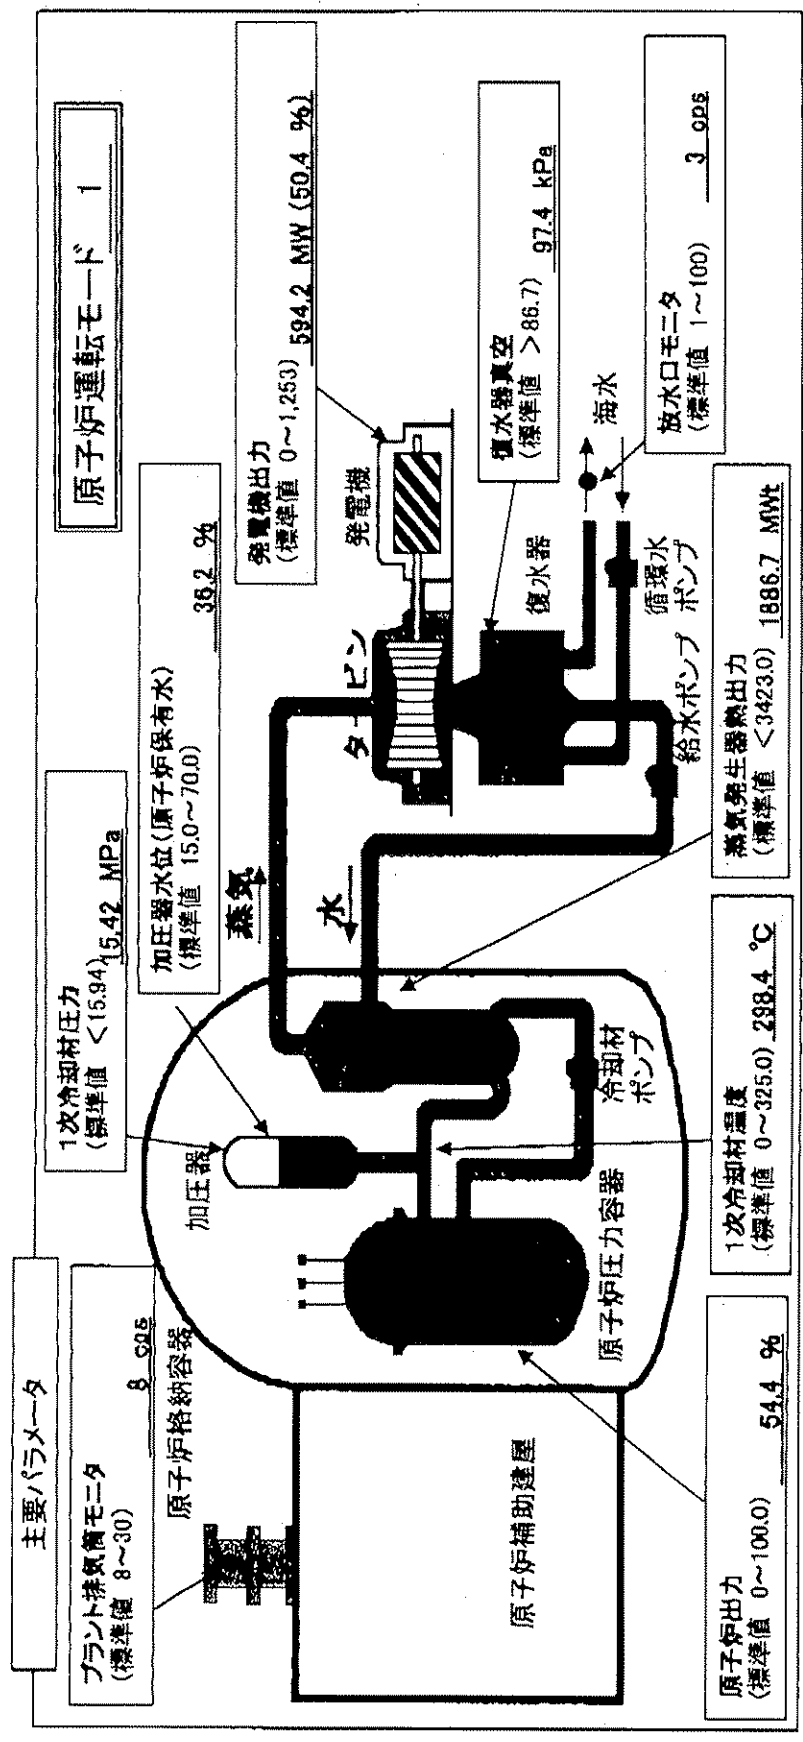

添付資料-2  
(2/2)

大飯発電所 4号機 運転パラメータ (平成24年7月6日13:00時点)

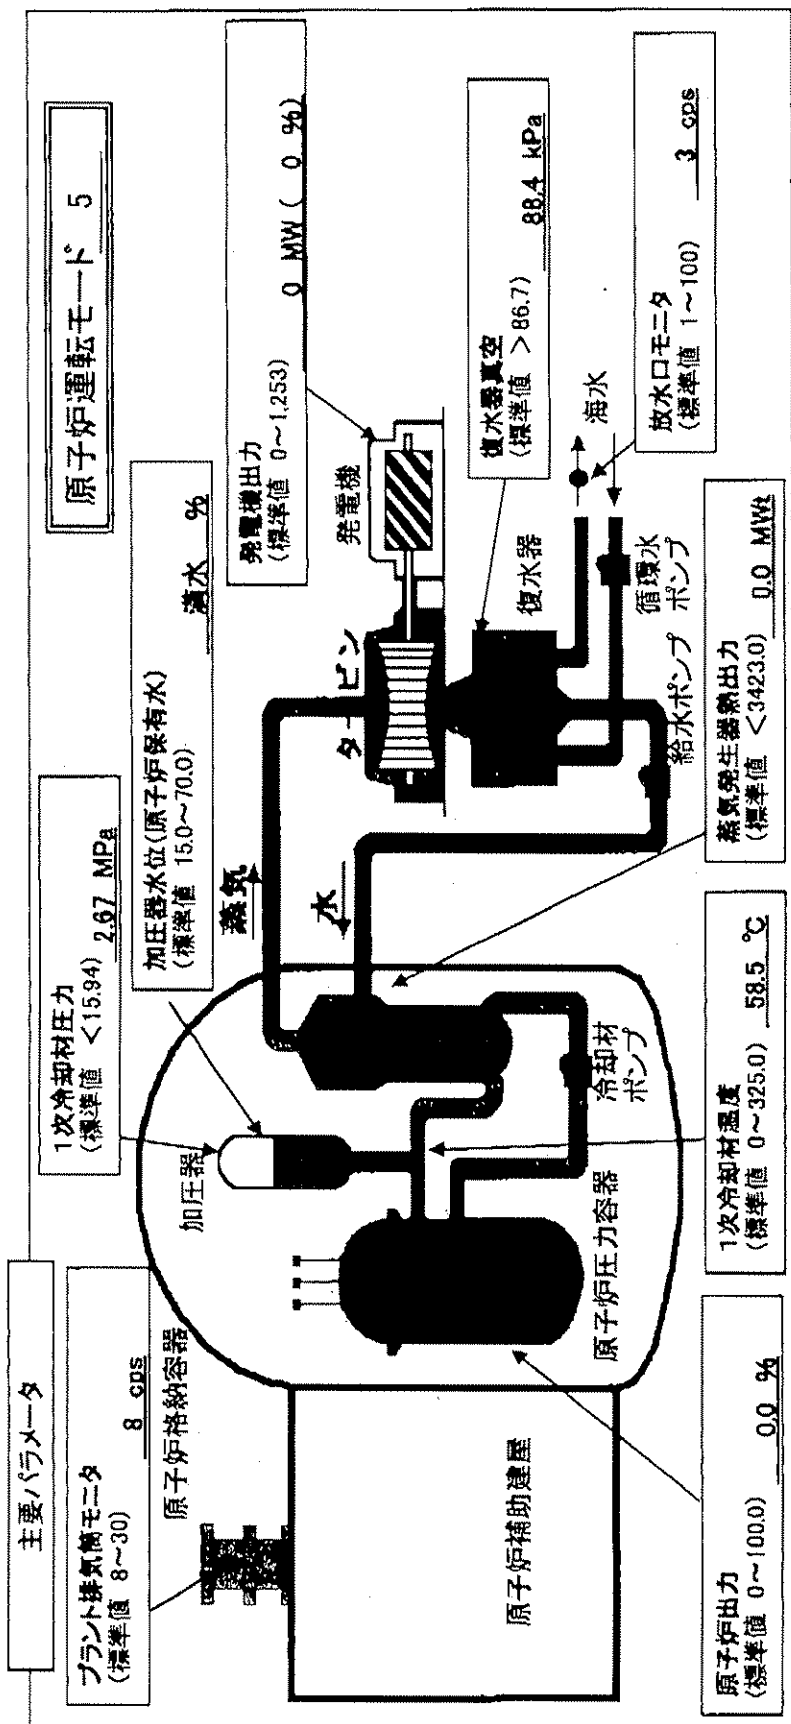

|                 |
|-----------------|
| 添付資料-3<br>(1/2) |
|-----------------|

## 大飯3号機 検査一覧表(定格熱出力一定運転まで) [7/6(金)]

### <定期事業者検査(事業者が実施)>

| 定期検査<br>対象 | 検査名                       | 完了<br>状況<br>(※1) | 検査実施状況(※2) |    |    |
|------------|---------------------------|------------------|------------|----|----|
|            |                           |                  | 昨日         | 本日 | 明日 |
| ☆          | 制御棒駆動系機能検査                | 全完               |            |    |    |
| ☆          | 主蒸気安全弁機能検査                | 全完               |            |    |    |
| ☆          | 蒸気タービン性能検査                | 全完               |            |    |    |
| ☆          | クラス1機器供用期間中検査             | 全完               |            |    |    |
| ☆          | 蒸気タービン性能検査(タービン過速度トリップ試験) | 全完               | ○          |    |    |
| ☆          | 加圧器逃がし弁漏えい検査              | 全完               |            |    |    |
| ☆          | 補助給水系機能検査                 | 全完               |            |    |    |
| ☆          | 原子炉停止余裕検査                 | 全完               |            |    |    |
| ☆          | 安全保護系設定値確認検査              | 一部<br>完了         |            |    |    |
|            | 炉物理検査                     | 一部<br>完了         |            | ○  |    |
|            | 構造健全性検査                   | 全完               |            |    |    |
|            | 1次冷却材ポンプ機能検査              | 一部<br>完了         |            |    |    |
|            | 核計装設備検査                   | 一部<br>完了         |            |    | ○  |
|            | 計測制御系機能検査                 | 一部<br>完了         |            |    |    |
|            | 計測制御系監視機能検査               | 一部<br>完了         |            |    |    |
|            | 放射線監視装置機能検査               | 一部<br>完了         |            |    |    |

### <使用前検査(国が実施)>

| 検査名  | 完了<br>状況<br>(※1) | 検査実施状況(※2) |    |    |
|------|------------------|------------|----|----|
|      |                  | 昨日         | 本日 | 明日 |
| ーなしー |                  |            |    |    |

※1: 定期事業者検査の全項目が完了した検査は「全完」、検査を継続するものは「一部完了」と記載。

※2: 昨日から明日にかけて、検査実施日に「○」を記載。

添付資料-3  
(2/2)

## 大飯4号機 検査一覧表(定格熱出力一定運転まで) [7/6(金)]

## &lt;定期事業者検査(事業者が実施)&gt;

| 定期検査対象 | 検査名                       | 完了状況(※1) | 検査実施状況(※2) |    |    |
|--------|---------------------------|----------|------------|----|----|
|        |                           |          | 昨日         | 本日 | 明日 |
| ☆      | 制御棒駆動系機能検査                |          |            |    |    |
| ☆      | 主蒸気安全弁機能検査                |          |            |    |    |
| ☆      | 蒸気タービン性能検査                | 一部完了     |            |    |    |
| ☆      | クラス1機器供用期間中検査             | 一部完了     |            |    |    |
| ☆      | 蒸気タービン性能検査(タービン過速度トリップ試験) |          |            |    |    |
| ☆      | 加圧器迷がし弁漏えい検査              |          |            |    |    |
| ☆      | 補助給水系機能検査                 | 一部完了     |            |    |    |
| ☆      | 原子炉停止余裕検査                 |          |            |    |    |
| ☆      | 安全保護系設定値確認検査              | 一部完了     |            |    |    |
| ☆      | 制御用空気圧縮系機能検査              | 一部完了     |            |    |    |
| ☆      | 蒸気タービン開放検査                | 全完       |            |    |    |
|        | 炉物理検査                     |          |            |    |    |
|        | 構造健全性検査                   | 一部完了     |            |    |    |
|        | 1次冷却材ポンプ機能検査              |          |            |    |    |
|        | 核計装設備検査                   | 一部完了     |            |    |    |
|        | 計測制御系機能検査                 |          |            |    |    |
|        | 計測制御系監視機能検査               | 一部完了     |            |    |    |
|        | 放射線監視装置機能検査               | 一部完了     |            |    |    |
|        | 2次系配管検査                   | 一部完了     |            |    |    |
|        | 2次系ポンプ機能検査                | 一部完了     |            | ○  |    |
|        | 総合インターロック検査               | 全完       |            |    |    |
|        | 制御棒位置指示装置設定値検査            | 一部完了     |            |    |    |

## &lt;使用前検査(国が実施)&gt;

| 検査名                | 完了状況(※1) | 検査実施状況(※2) |    |    |
|--------------------|----------|------------|----|----|
|                    |          | 昨日         | 本日 | 明日 |
| 加圧器管台他補修工事(イ)使用前検査 |          |            |    |    |

※1:定期事業者検査の全項目が完了した検査は「全完」、検査を継続するものは「一部完了」と記載。

※2:昨日から明日にかけて、検査実施日に「○」を記載。
