

大飯発電所3号機、4号機のプラント起動状況について (お知らせ)

平成24年6月27日  
関西電力株式会社

平成24年6月27日における大飯発電所3号機、4号機のプラント  
起動状況について別添のとおりお知らせします。

以上

6/27(水)15時版

関西電力(株)  
大飯発電所

大飯発電所3、4号機のプラント起動状況について  
(6月27日(水)14時時点)

## 1. 定期検査工程の進捗状況

	3号機	4号機
本日の状況	1次冷却材系統漏えい確認	2次系クリーンアップ等 ・タービン主要弁調整
明日の予定	起動前弁点検 起動に伴う諸検査 ・1次冷却材系統昇温 ・各種点検・試験	2次系クリーンアップ等 ・タービン主要弁調整 ・復水器水張り

添付資料-1:定期検査工程表

## 2. 発電所の運転状況(パラメータ)

プラント状態は異常なし

添付資料-2:大飯3号機運転状況(パラメータ 13時時点)

大飯4号機運転状況(パラメータ 13時時点)

## 3. 諸検査の状況

本日の検査実績なし

明日の検査予定あり


添付資料-3:検査一覧表

## 4. 特記事項

3号機「C直流地絡」警報発信についての原因を調査中。

添付資料-1



大飯発電所3号機、4号機の作業工程

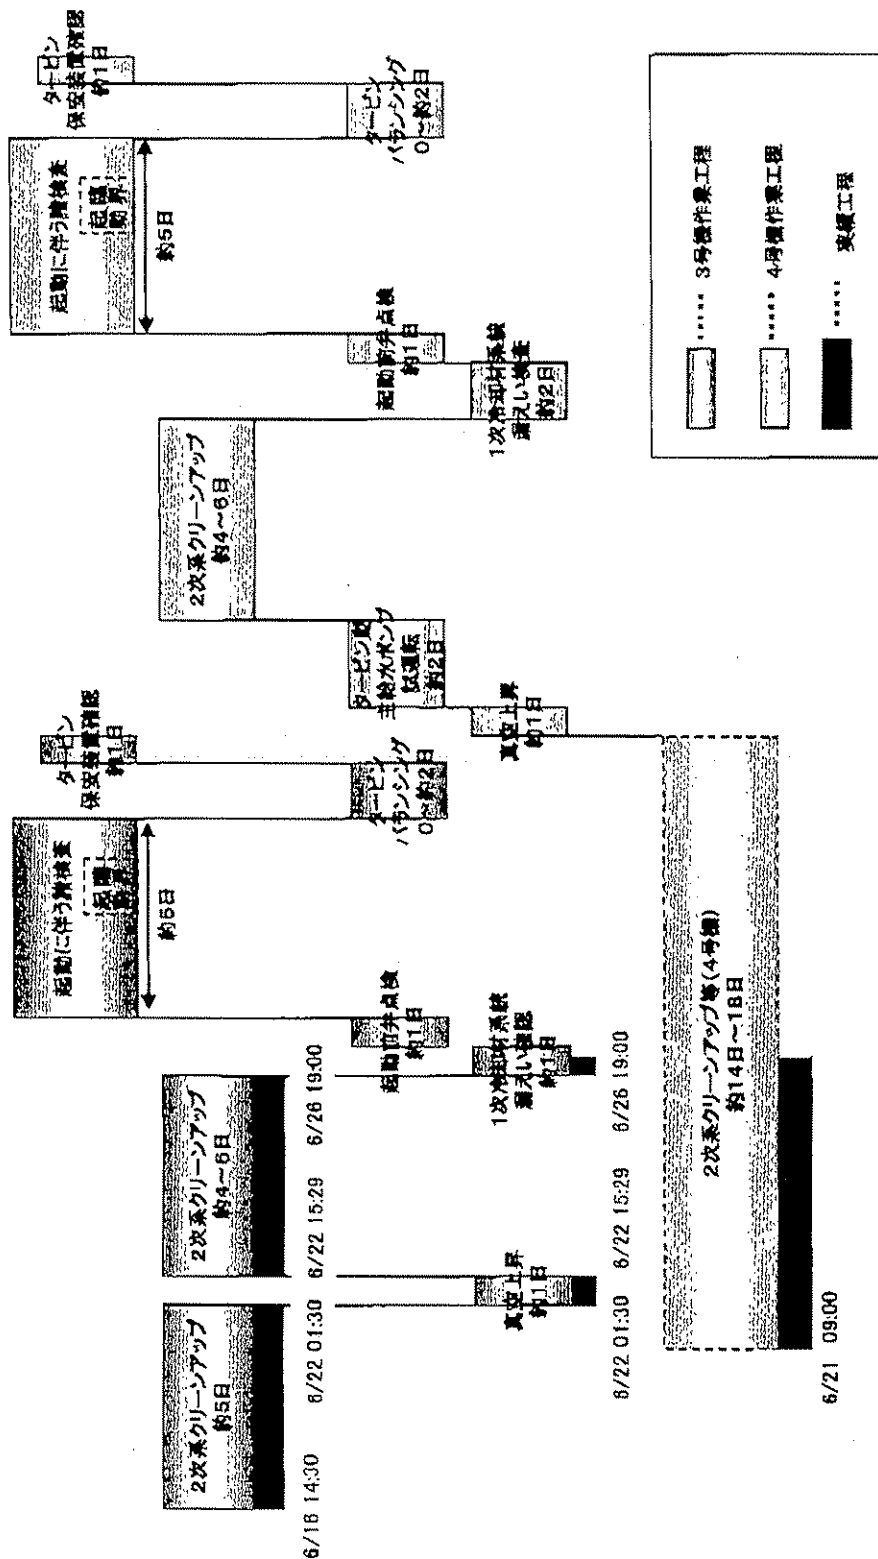

※作業の状況により、工程を変更する場合があります


大飯発電所 3号機 運転パラメータ (平成24年6月27日13:00時点)

添付資料-2  
(1/2)

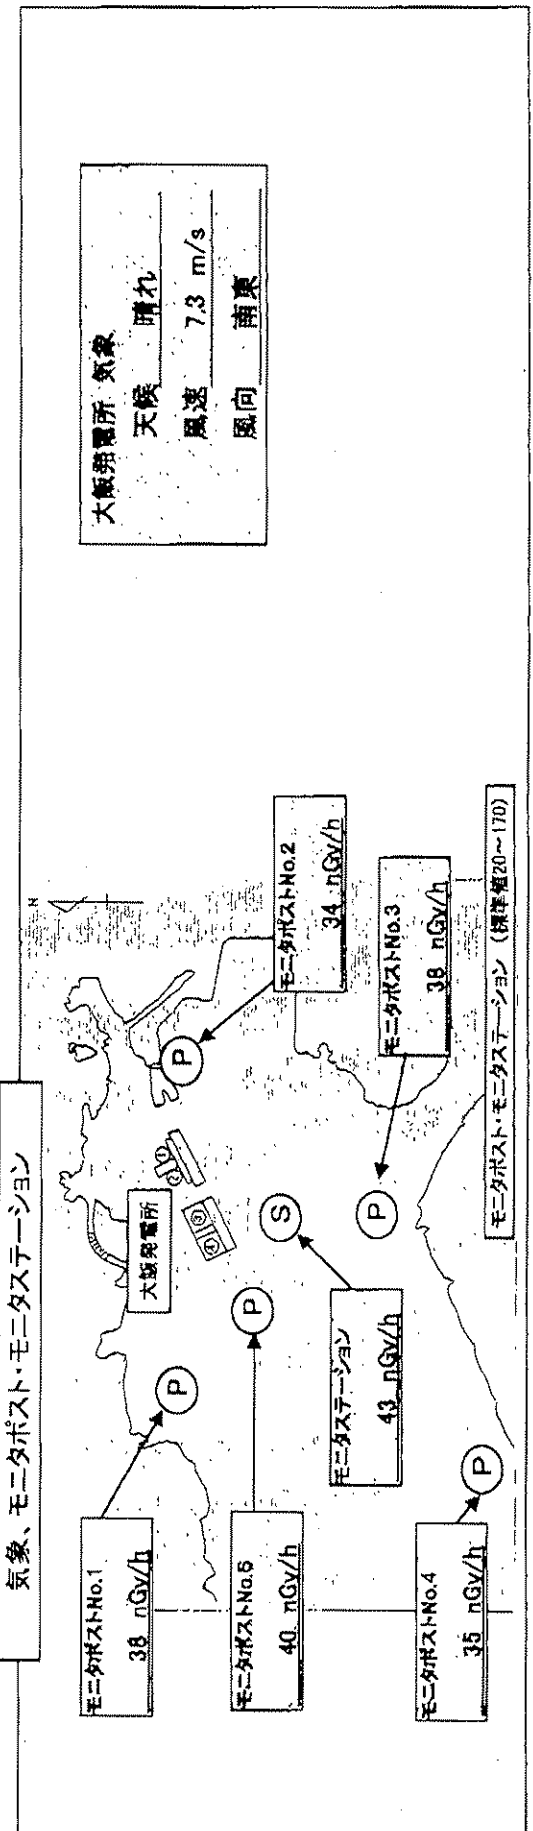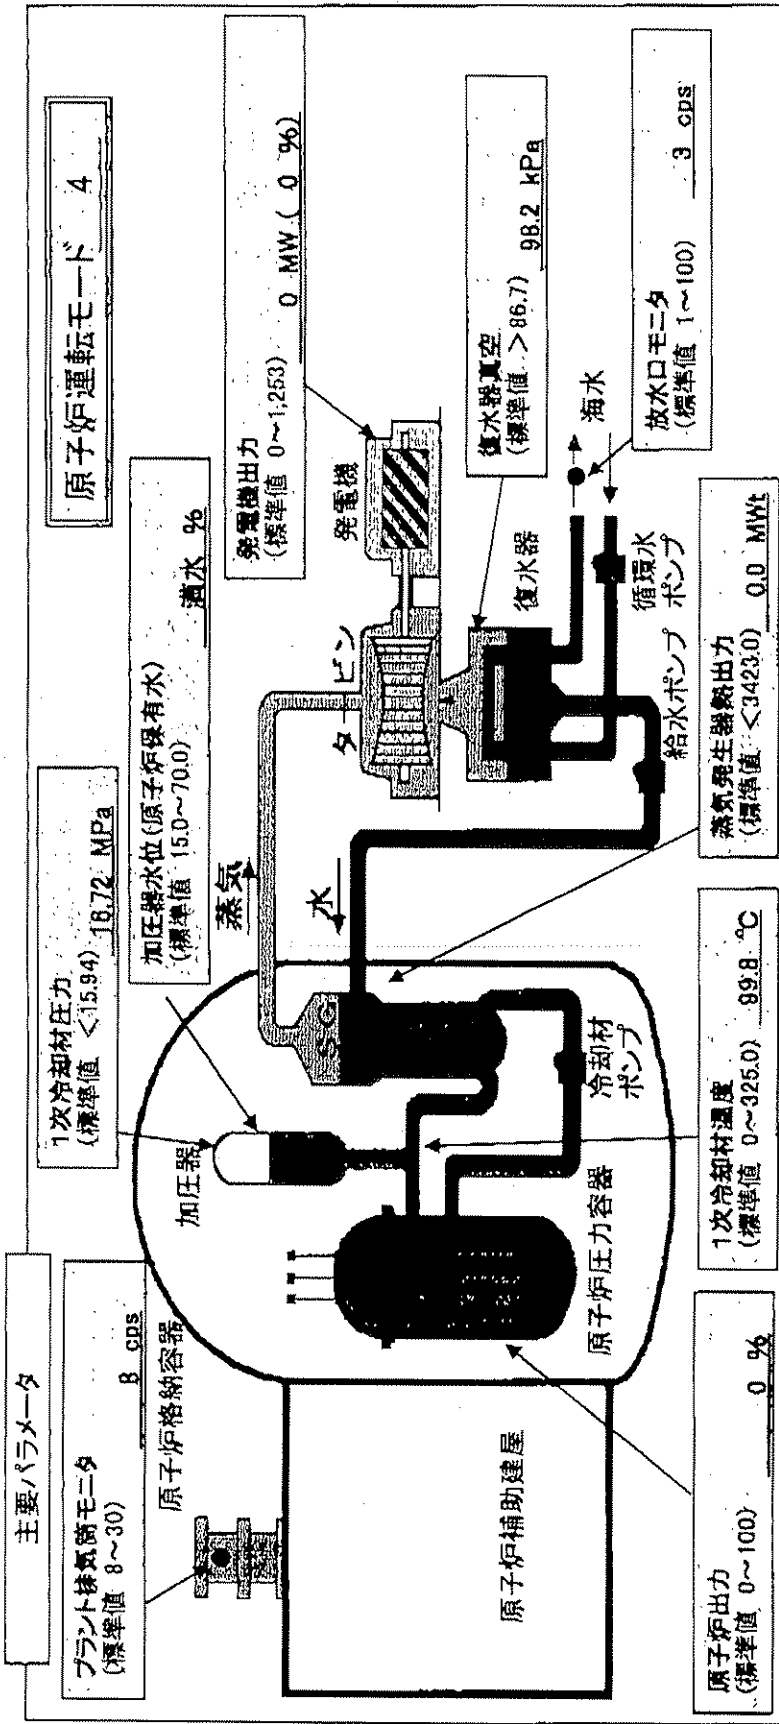

添付資料-2  
(2/2)

大飯発電所 4号機 運転パラメータ (平成24年6月27日13:00時点)

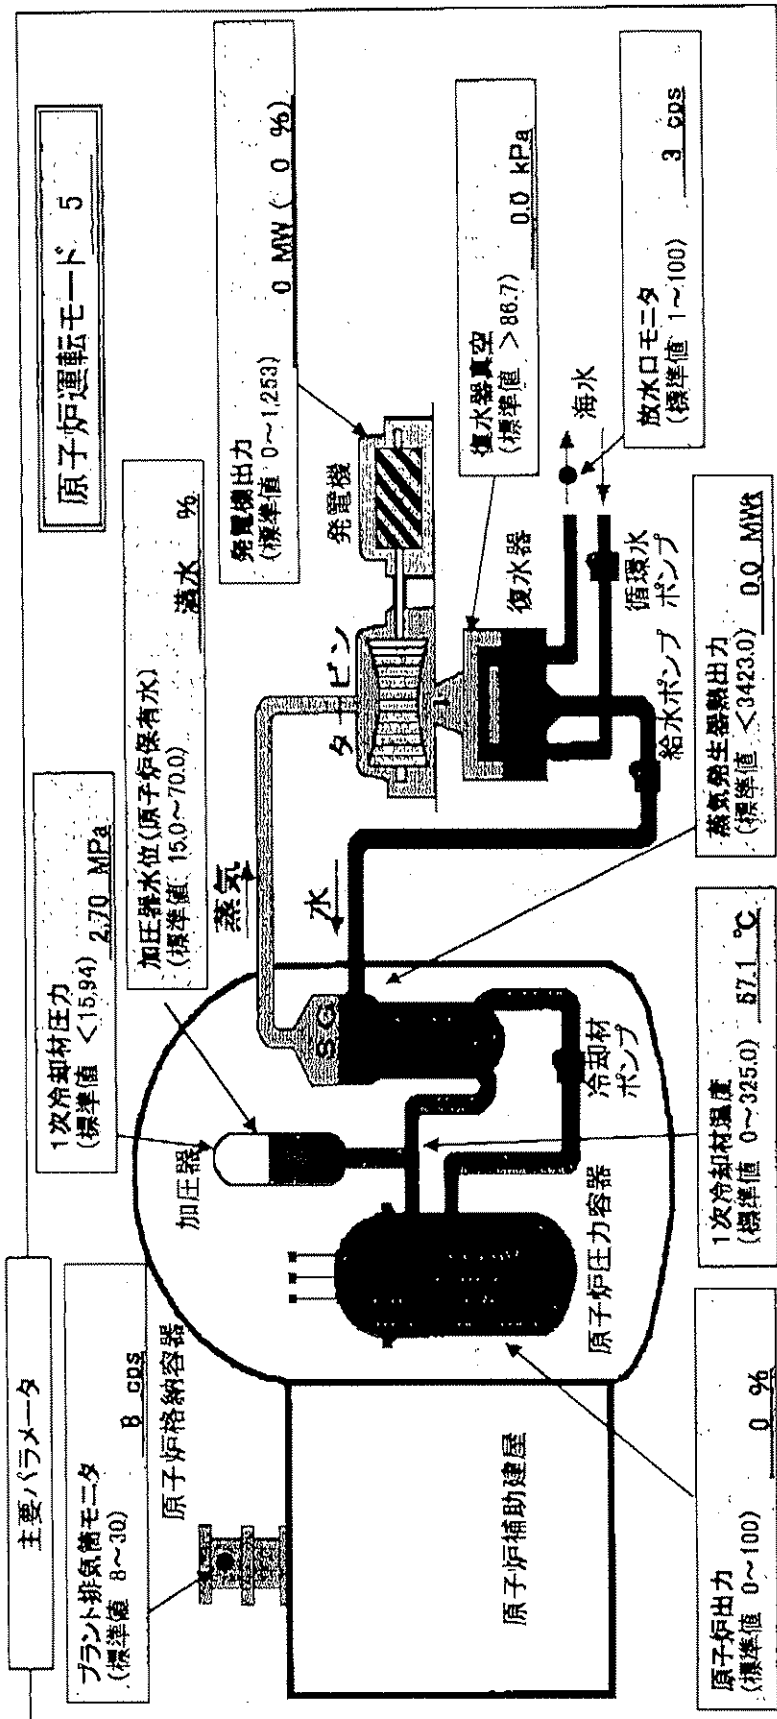

添付資料-3  
(1/2)

## 大飯3号機 検査一覧表(定格熱出力一定運転まで) [6/27(水)]

### <定期事業者検査(事業者が実施)>

定期検査 対象	検査名	完了 状況 (※1)	検査実施状況(※2)		
			昨日	本日	明日
☆	制御棒駆動系機能検査				
☆	主蒸気安全弁機能検査				
☆	蒸気タービン性能検査				
☆	クラス1機器供用期間中検査				
☆	蒸気タービン性能検査(タービン過速度トリップ試験)				
☆	加圧器逃がし弁漏えい検査				
☆	補助給水系機能検査				
☆	原子炉停止余裕検査				
☆	安全保護系設定値確認検査				
	炉物理検査				
	構造健全性検査				
	1次冷却材ポンプ機能検査				
	核計装設備検査				
	計測制御系機能検査				
	計測制御系監視機能検査				
	放射線監視装置機能検査	一部 完了	○		

### <使用前検査(国が実施)>

検査名	完了 状況 (※1)	検査実施状況(※2)		
		昨日	本日	明日
-なし-				

※1:定期事業者検査の全項目が完了した検査は「全完」、検査を継続するものは「一部完了」と記載。

※2:昨日から明日にかけて、検査実施日に「○」を記載。

添付資料-3  
(2/2)

## 大飯4号機 検査一覧表(定格熱出力一定運転まで) [6/27(水)]

## &lt;定期事業者検査(事業者が実施)&gt;

定期検査 対象	検査名	完了 状況 (※1)	検査実施状況(※2)		
			昨日	本日	明日
☆	制御棒駆動系機能検査				
☆	主蒸気安全弁機能検査				
☆	蒸気タービン性能検査				
☆	クラス1機器供用期間中検査				
☆	蒸気タービン性能検査(タービン過速度トリップ試験)				
☆	加圧器逃がし弁漏えい検査				
☆	補助給水系機能検査				
☆	原子炉停止余裕検査				
☆	安全保護系設定値確認検査				
☆	制御用空気圧縮系機能検査				
☆	蒸気タービン開放検査				
	炉物理検査				
	構造健全性検査				
	1次冷却材ポンプ機能検査				
	核計装設備検査				
	計測制御系機能検査				
	計測制御系監視機能検査				○
	放射線監視装置機能検査				
	2次系配管検査				
	2次系ポンプ機能検査				
	総合インターロック検査				
	制御棒位置指示装置設定値検査				

## &lt;使用前検査(国が実施)&gt;

検査名	完了 状況 (※1)	検査実施状況(※2)		
		昨日	本日	明日
加圧器管台他補修工事(イ)使用前検査				

※1:定期事業者検査の全項目が完了した検査は「全完」、検査を継続するものは「一部完了」と記載。  
 ※2:昨日から明日にかけて、検査実施日に「○」を記載。
