

岐阜県 内ヶ谷ダム 工事進捗状況(令和2年8月末現在)

ダムサイト状況

工事用道路状況

① ダムサイト状況(上流上空より望む)



③ ダムサイト左岸状況(右岸上空より望む)





④ ダムサイト右岸状況(左岸上空より望む)



⑤ 下流工事用道路状況



② ダムサイト状況(下流上空より望む)

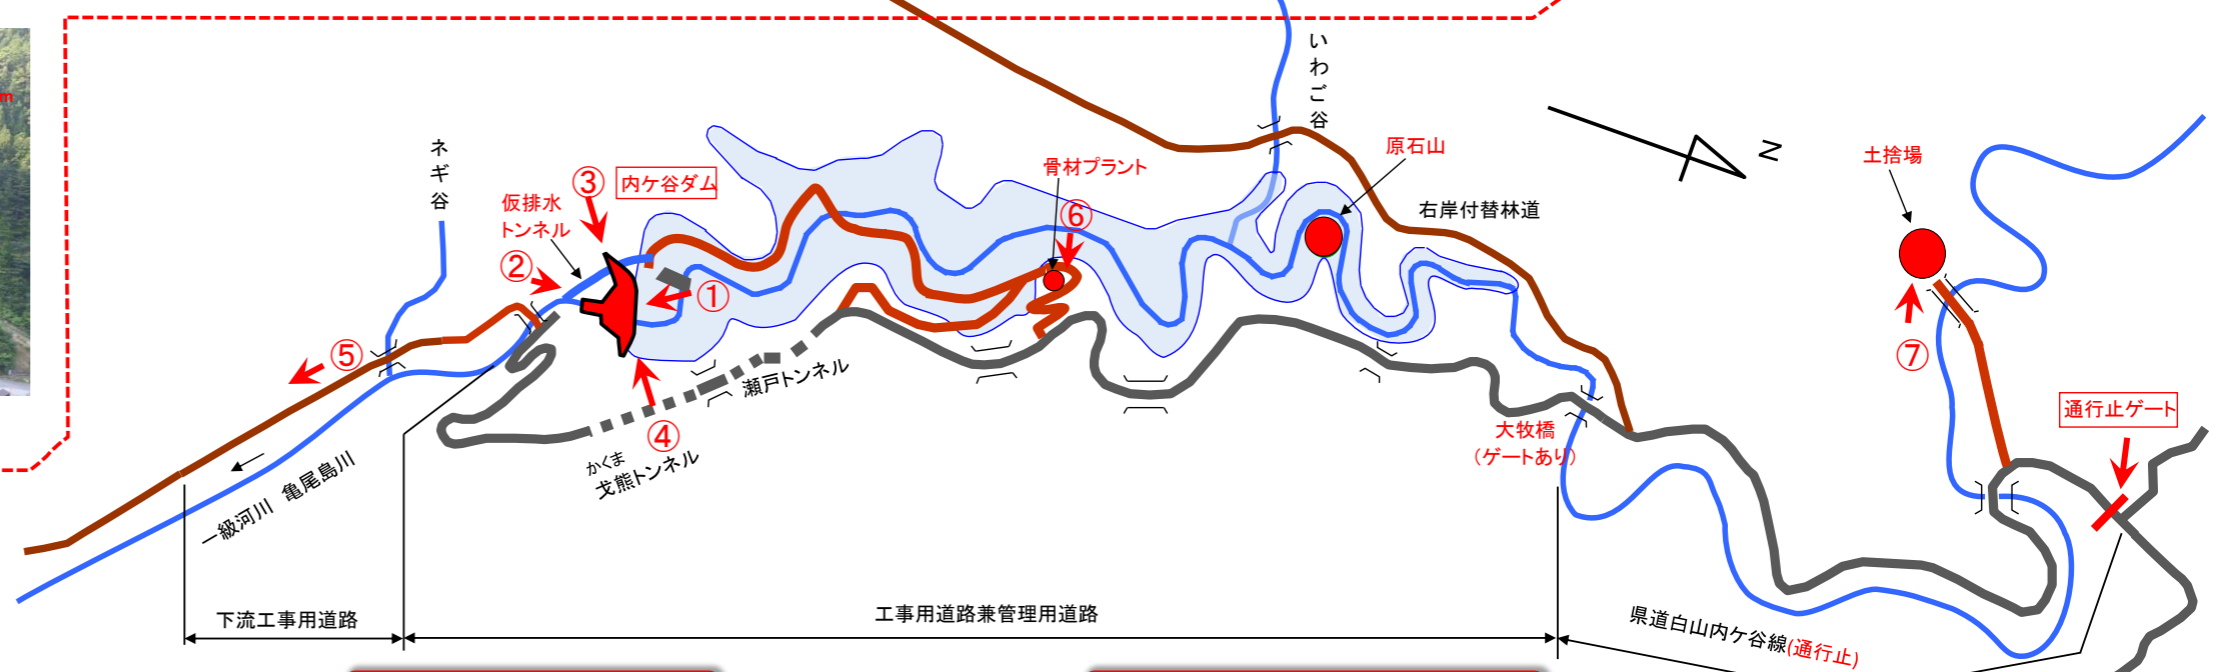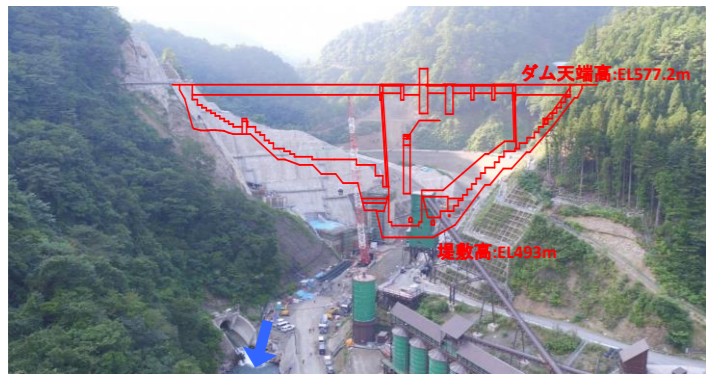

仮設設備状況

タワークレーン基礎施工状況

⑥ 骨材製造設備稼働状況



⑦ タワークレーン基礎施工状況



タワークレーンを設置する際の基礎コンクリートの打設が完了しました。この基礎の上に高さ約30m,作業半径約85mのタワークレーンを設置します。タワークレーンは一度に4.5m³のコンクリートを打設することができます。

