

平成27年度に建設工事で発生した事故事例（墜落・転落による事故）

事故概要:

函渠工の丁張作業終了後、第3者が開口部に落ちないように土留め矢板に転落防止ネットを取付中に、ネットが矢板に引っかかったため、作業員が切梁のH鋼に乗ってネットを外そうとしたところ、バランスを崩して転落し負傷した

事故原因:

- ・本人の不注意

改善対策:

- ・安全教育の徹底
- ・作業時には親綱を設置し安全帯を使用する



転落防止ネット

分類: 安全対策、ネット張

被害状況: 2日間の安静加療(頭部顔面打撲、顔面挫裂創、顔面・右肘擦過傷)

平成28年度に建設工事で発生した事件事例（墜落・転落による事故）

【事故概要】


岩盤掘削（大型ブレイカ作業）時の飛び石を防ぐため、作業員1名が移動式足場（H=1.8m）で飛散防止シートを取り付けようとした際、突風にあおられ足場が転倒、作業員が転落、負傷した。

【事故原因】

・突風によるリスクが検討されていなかった

【改善対策】

・突風によるリスクを考慮した、飛散防止対策とする
・危険予知活動の徹底

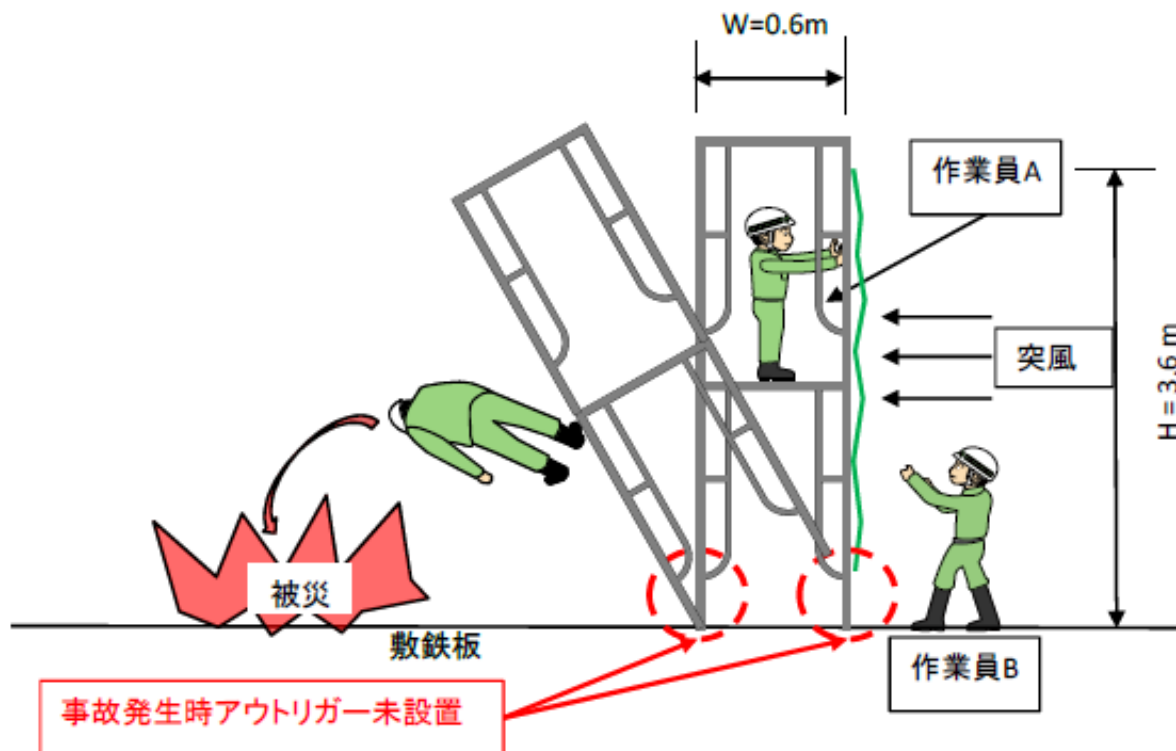

分類:安全対策、ネット張

被害状況:頭蓋骨・左頬骨骨折、全治4週間
